

2026년 서울안전한마당

행사 대행 용역

서울특별시 소방재난본부

2026. 9. 17.(목) ~ 9. 19.(토) / 3일간
여의도공원 (서울 영등포구 소재)

[제안사 영역]

2025. 12.

CONTENTS

I 제안 개요

사업 이해 · 과업 본질 파악 · 제안 특징점 · 콘셉트

II 일반 부문

제안사 현황 · 조직 구성 · 유사 실적

III 사업 수행 부문

수행 전략 · 개막식 · 프로그램 · 무대·공간 계획 · 운영 관리 · 기상악화 대응

IV 홍보 마케팅

홍보 전략 · 온·오프라인 · 영상 · 참여 확산

V 사업 관리

일정 · 조직 · 안전 · 리스크 · 품질 · 산출물 · 예산



제안 개요

사업 이해와 제안 방향

19년 역사의 국내 최대 안전문화행사, 시민 일상에 뿌리내리는 안전 감수성 확산의 장

2007년부터 매년 개최 / 2025년 70개 부스 × 82개 체험 프로그램

현재

전국 유일 3일간 운영되는 대규모 안전체험 축제

2007년 첫 개최 이후 누적 참가자 57만 명

민관 협력 70개 부스, 생활안전부터 재난대응까지 전 영역 체험

가족 단위 방문객 73%, 만족도 평균 4.7점 기록

서울안전한마당 = 국내 안전문화 전파 거점 행사

2026년 기회

여의도공원 15,000m² 규모로 확대 이전

최대 동시 수용 3,400명, 3일간 총 30,000명 목표

100개 몽골텐트 부스로 체험 다양성 강화

VR 골든타임 체험 등 첨단 안전 콘텐츠 신규 도입

체험을 넘어 기억으로, 기억을 넘어 일상 안전 습관으로



19년간 쌓아온 안전문화 확산 모델을 2026년 여의도공원에서 새로운 차원으로 확장

3일간 3만 명 규모 안전체험 축제를 무사고로 열어내는 것이 과업의 핵심

동시 수용 3,400명 / 안전관리비 순공사비 1.25% 이상

동시 체험 동선 관리

70개 부스 × 30명 수용 = 동시 2,100명 체험
동선 관리 체계

부스별 대기 인원 30명 제한, 회전율 15분 기준
으로 1시간당 120명 처리

6개 Zone 분리로 동선 혼잡 방지, Zone당 평균
350명 분산 수용

편의시설 배치
수유실 2개소, 휴게소 3개소, 분실물센터 1개소

화장실 접근 거리 50m 이내 유지

9월 여의도 기상 리스크

9월 서울 평균 강수량 시간당 12mm, 순간 풍속
15m/s 이상 발생 빈도 연 8회

우천 4단계 매뉴얼: 평시 → 주의(5mm/h) → 경
계(15mm/h) → 위험(30mm/h)

강풍 3단계 매뉴얼: 평시 → 주의(10m/s) → 위험
(15m/s)

실내 전환 체험존 확보
비가 와도 중단 없이 실내 VR 체험존, 안전 기억 아카
이브 부스로 즉시 전환

트러스 구조 안전성 검증

메인 무대 트러스 12m × 8m × 6m(높이), 하
중 2톤 이상 견딜 수 있는 구조 설계

그늘막 트러스 50개소, 각 3m × 3m 규격, 풍속
20m/s 견딜 수 있는 앵커 고정

설치 전 구조 안전 진단서 제출, 설치 후 육안 점검
1일 2회

안전관리비 확보
순공사비 1.25% 이상 확보, 안전 관리 인력 20명 투입

3일간 3만 명 참여, 동시 수용 3,400명을 안전하게 수용하는 체계가 과업 성패를 결정

체험에서 기억으로, 기억에서 일상으로 이어지는 안전문화 확산 구조

서사 중심 개막식 설계

세 세대 릴레이 토치로 감정 몰입 확보

무대 중앙 화분 점화 순간 전체 조명 점등

20분 퍼포먼스를 서사 흐름으로 구성

기념식을 단순 선언이 아닌 체험 시작점으로 전환

관람객이 행사 전체를 하나의 여정으로 인식하게
만드는 감정 설계

시민 참여형 프로그램 2종

119 골든타임 VR 체험으로 구급대원 시점
경험

안전 기억 아카이브 부스로 시민 사연 전시

관람을 넘어 직접 참여하는 구조

체험 결과물을 SNS 콘텐츠로 전환해 일상 확산

관객이 안전 메시지를 스스로 재생산하는 참여 체
계

기상 대응 유연 구조

우천 시 실내 체험존 즉시 전환

강풍 4단계 매뉴얼로 평시부터 위험까지 대응

행사 중단 없는 유연 운영

기상 악화를 서사 안에 녹여 프로그램 연속성 유지

참가자 안전을 최우선하면서도 몰입 끊김 방지

1회성 행사를 넘어 시민 일상에 뿌리내리는 안전 감수성 확산 전략

빛을 지키는 순간들

세 세대가 이어받은 빛, 서울의 안전을 밝힙니다

릴레이 토치·야간 조명·VR 체험이 하나의 여정으로 연결되는 안전 서사

개막식 릴레이 토치

3세대가 이어받은 빛이 무대 중앙 화분에 꽃히면 전체 조명 점등. 세대 간 안전문화 계승을 시각화하는 20분 퍼포먼스. 개막식 당일 오후 2시 메인 무대에서 진행.

야간 안전 조명 설치물

50개 조명 설치물을 여의도공원 산책로 양측에 배치해 야간 포토존 연출. LED 전구 800W×50개소로 일몰 후 6시부터 9시까지 3시간 점등. 안전 표어 각인.

119 골든타임 VR 체험

시민이 구급대원 시점으로 심폐소생술 과정 경험. VR 헤드셋 20대 동시 운영, 1회당 체험 시간 8분. 구급차 내부 형태 부스 조성으로 현장감 극대화. Zone 3 배치.

안전 기억 아카이브

시민 제보 안전 사연을 타임라인 구조로 전시. 2007년부터 2026년까지 안전문화 변천사 시각화. 부스 규모 6m×4m, 패널 12개 배치. 사전 공모 접수 200건 목표.

4개 프로그램이 릴레이 토치 점화부터 야간 조명 산책, VR 체험, 아카이브 관람으로 이어지는 동선 설계. 참여자가 체험에서 기억으로, 기억에서 일상으로 연결되는 3시간 여정 완성.

[2D 키비주얼 시안 자리]

메인 포스터 시안 / SNS 홍보 배너 시안

현수막·X배너·가로등배너 디자인

리플렛·브로슈어·유도사인 디자인

디자이너 작업 영역


디자이너 영역 — 2D 키비주얼 시안 placeholder

온라인 홍보 콘텐츠 예시 / 영상 썸네일 디자인 / 포토존 그래픽 시안

[2D 키비주얼 시안 자리]

키비주얼 활용 홍보물·행사 한정판 굿즈·포스터·리플렛 디자인

디자이너 작업 영역 — 풀컬러 2D 키비주얼·영상 썸네일·포토존 그래픽 후속 작업



일반 부문

[제안사 정보]

회사명 / 사업자등록번호 / 대표자
주소 / 전화번호
설립연도 / 해당부문 종사기간 / 임직원수
면허·허가·등록증 보유현황

디자이너 / 사용자가 채울 자리

전담 조직 5개·총 12명, 기획부터 철거까지 전 과정 책임 체계

[조직 구성도]

총괄 PM / 기획파트장·운영파트장·안전파트장·홍보파트장 / 각 파트별 실무 매니저 2명 / 현장 스태프 별도 배치


국민연금·건강보험 가입증명서 / 4대보험 완납 확인서 / 근로계약서 사본

※ 디자이너/사용자가 실제 조직도·인력 명단·증빙 서류를 본 영역에 배치

[유사 사업 실적]

최근 10년간 건별 1억원 이상 실적
문화예술행사 · 축제 · 안전체험 프로그램
검사완료 확인서

디자이너 · 사용자가 채울 자리

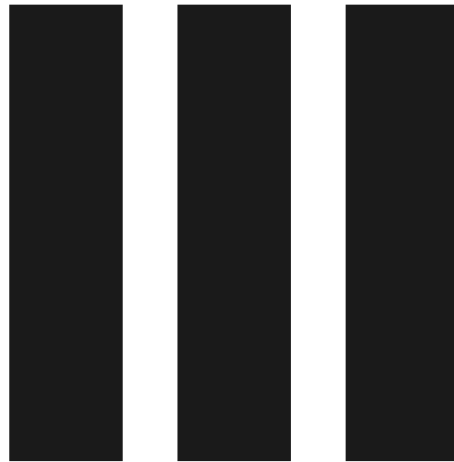

사업 수행 부문

체험 동선·안전 관리·기상 대응을 하나의 시스템으로 통합 운영

70개 부스 × 30명 수용 / 예약 시스템으로 밀집 방지


행사 7일 전부터 매일 기상정보 체크로 리스크 최소화, 상황별 즉시 대응 체계 구축



4단계 매뉴얼로 평시부터 위험까지 상황별 대응 체계 구축

평시 → 주의 → 경계 → 위험

기상 정보 수집 및 단계별 조치 체계

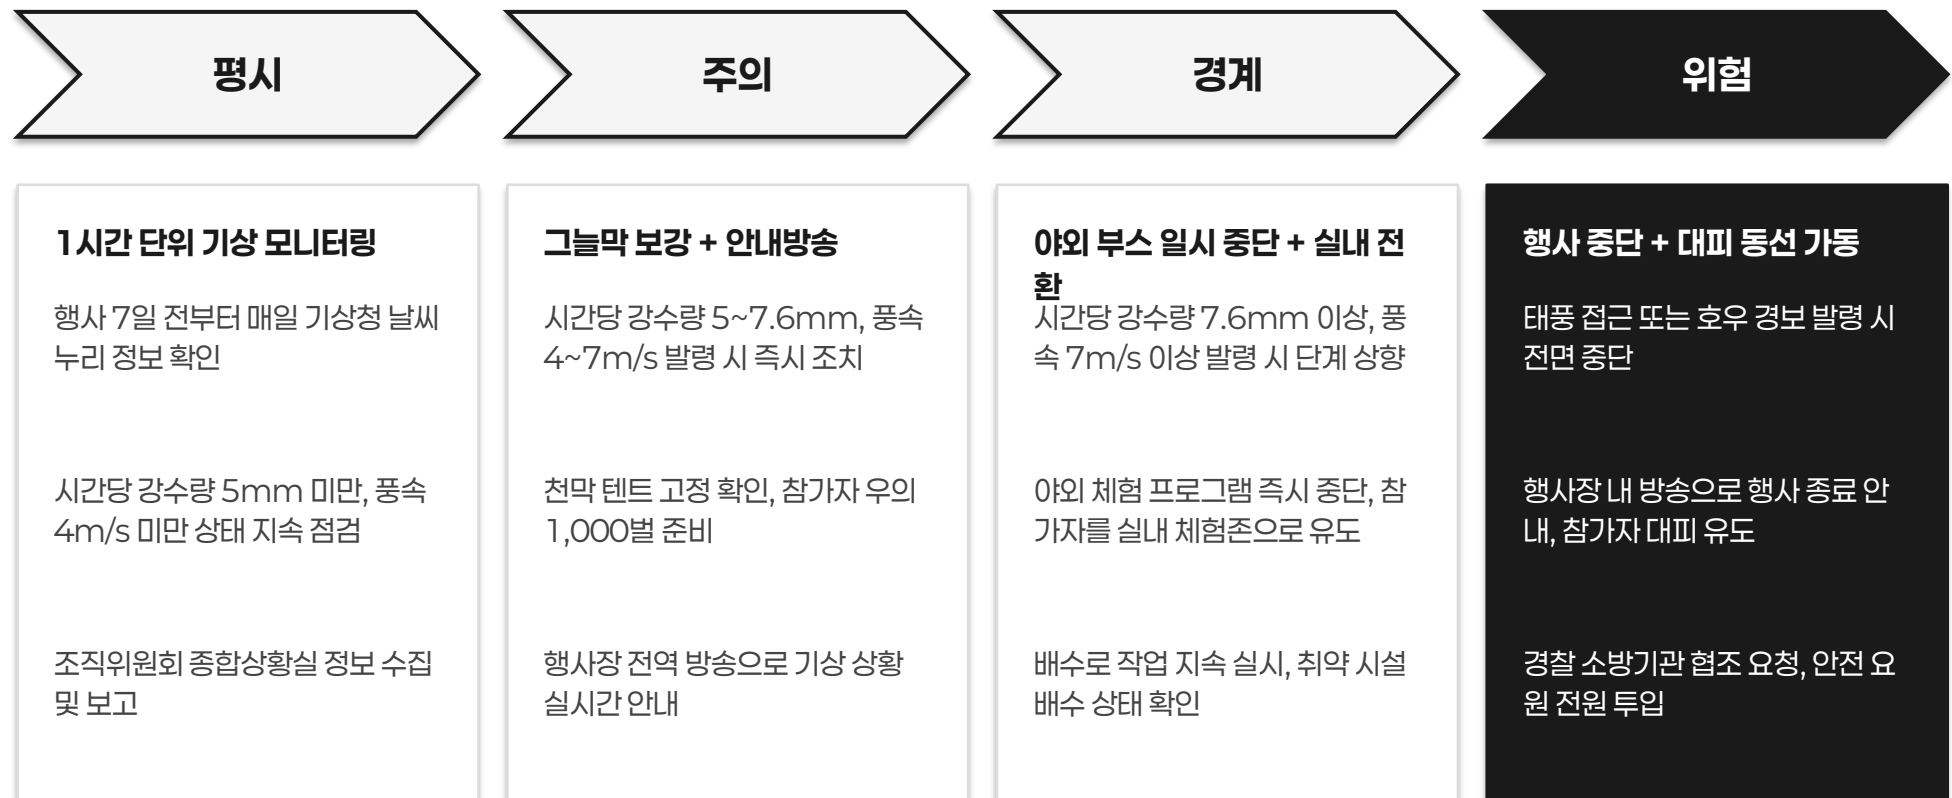

세 세대가 이어받은 빛이 무대 전체를 밝히는 20분 개막 퍼포먼스

LED 안전봉 3개 릴레이 / 무대 트러스 조명 점등 연출

0~3분

2007~2026 타임랩스
영상 상영

19년 서울안전한마당 역사를 5분 영상으로 압축. 무대 후면 LED 12m×8m 전면 송출. 2007년 첫 개최 사진부터 2026년 준비 현장까지 연도별 슬라이드 쇼. 객석 3,000명이 스크린 주목하는 동안 무대 측면에서 3세대 주자 대기.

3~7분

3세대 릴레이 토치 점화

1세대 할아버지, 2세대 부모, 3세대 어린이가 LED 안전봉 3개를 순차 점화. 각 세대가 무대 좌→중→우 동선으로 이동하며 릴레이. 3분 간격 점화 완료 시 무대 중앙 서울시 BI 화분에 3개 안전봉 동시 꽃기. 전체 소요 시간 4분, 배경음악 오케스트라.

7~12분

시장 선언문 + 자치구 랜턴
점등

오세훈 시장 안전 선언문 낭독 2분. 선언문 끝과 동시에 무대 좌우 25개 자치구 대표 랜턴 일제히 점등. 랜턴 크기 30cm×30cm, LED 내장. 각 자치구 이름 새긴 투명 아크릴 큐브. 점등 시 무대 전체 조명 밝기 30lux에서 150lux로 상승.

12~20분

객석 반사 팔찌 동시 점등

객석 3,000명 전원에게 사전 배포한 반사 팔찌를 무선 신호로 일제 점등. 팔찌 배터리 CR2032 내장, 블루투스 동기화. 무대 조명 150lux에서 300lux로 전환. 객석 전체가 빛의 물결로 일렁이는 순간 개막 선언. 배경음악 EDM 리믹스 5분.

연출 포인트

세 세대가 이어받은 안전의 빛이 무대를 넘어 객석 전체로 확산되는 여정 설계. 타임랩스로 과거를 응축하고, 릴레이 토치로 현재를 상징하며, 반사 팔찌로 미래 시민 참여를 시각화. 20분 개막식이 단순 식순이 아니라 안전문화 확산의 서사로 기억되도록 조명·음향·소품을 하나의 흐름으로 통합.

릴레이 토치 점화가 무대 중앙 서울시 BI 화분에 꽃히면 전체 조명 점등

1세대: 2007년 첫 행사 참여 소방관 / 2세대: 현직 구급대원 10년차 / 3세대: 청소년 안전지킴이

릴레이 토치 점화 퍼포먼스

#1. 1세대 소방관 무대 좌측 입장

2007년 첫 행사 참여 소방관이 LED 안전봉 1개를 들고 무대 좌측에서 등장, 관객석을 향해 인사 후 화분 방향으로 이동

#2. 2세대 구급대원 무대 중앙 입장

현직 구급대원 10년차가 LED 안전봉 1개를 들고 무대 중앙에서 등장, 1세대와 합류해 함께 화분으로 이동

#3. 3세대 청소년 안전지킴이 무대 우측 입장

청소년 안전지킴이 대표 1명이 LED 안전봉 1개를 들고 무대 우측에서 등장, 1·2세대와 합류

#4. LED 안전봉 3개 동시 삽입

세 세대가 무대 중앙 서울시 BI 화분에 LED 안전봉 3개를 동시에 삽입, 센서 작동으로 무대 트러스 전체 조명이 3초 간격 순차 점등

※ LED 안전봉 사양: 길이 45cm, 지름 3cm, 발광색 백색 3,000K

조명 연출 시스템

무대 트러스 전체 조명 3초 간격 순차 점등

무대 좌측부터 우측까지 총 18개 조명이 3초 간격으로 순차 점등, 전체 점등 완료까지 54초 소요

객석 반사 팔찌 3,000개 동시 점등

조명 점등 완료 시점에 객석 참여자가 착용한 반사 팔찌 3,000개가 동시 점등, 무대와 객석이 하나의 빛으로 연결

VIP 포토존 중앙 배치

조명 점등 완료 후 VIP 6명이 화분 양옆에 도열, 중앙 포토존에서 기념 촬영 진행해 언론 노출 확보

BGM 및 음향 연출

점화 시점부터 조명 점등 완료까지 감성적 BGM 54초 재생, 점등 완료 시 환호성 효과음 3초 송출

※ 조명 사양: LED PAR 18개, 각 200W, 총 3,600W 전력 소비

70개 부스를 6개 Zone으로 분리해 동선 혼잡 방지와 체험 몰입 강화

Zone당 평균 12개 부스 / 예약 시스템 30분 단위 회차 운영

Zone A 소방·화재 대응

부스 수: 15개

핵심 프로그램:

화재 진압 VR 체험, 소화기 실사용, 완강기 탈출, 연기 미로 탈출, 화재 신고 시뮬레이션

운영 방식:

회차당 25명, 1일 총 12회 운영, 소방관 안전 요원 상주

Zone B 응급처치·심폐소생술

부스 수: 12개

핵심 프로그램:

CPR 마네킹 실습, 하임리히법, AED 작동, 지혈·골절 응급처치, 119 신고 요령

운영 방식:

회차당 20명, 1일 총 14회 운영, 응급구조사 상주 지도

Zone C 재난·지진 체험

부스 수: 10개

핵심 프로그램:

지진 시뮬레이터, 붕괴 건물 탈출, 재난문자 발송 시연, 대피소 찾기, 비상배낭 체험

운영 방식:

회차당 30명, 1일 총 10회 운영, 안전 매트 깔고 진행

Zone D 교통안전·어린이 안전

부스 수: 13개

핵심 프로그램:

어린이 교통안전 VR, 자전거 안전 장구 착용, 보행 신호 체험, 카시트 올바른 착용법, 실종 예방 지문 등록

운영 방식:

회차당 35명, 1일 총 15회 운영, 가족 단위 참여 우선

Zone E 생활안전·범죄 예방

부스 수: 10개

핵심 프로그램:

보이스피싱 대응 시뮬레이션, 호신술 체험, 승강기 비상 대응, 가스 안전 점검, 전기 감전 예방

운영 방식:

회차당 25명, 1일 총 12회 운영, 경찰·소방 합동 진행

Zone F 야외 특수 체험

부스 수: 10개

핵심 프로그램:

완강기 실제 하강, 물놀이 안전 교육, 산악 조난 신호, 드론 수색 시연, 구명조끼 착용법

운영 방식:

회차당 20명, 1일 총 10회 운영, 높이 12m 트러스 구조물 안전 검증 완료

Zone 간 이동 동선은 5m 폭 메인 통로로 확보해 혼잡 최소화, 각 Zone 입구에 대기 인원 표시 전광판 설치로 실시간 정보 제공

각 Zone마다 대표 프로그램 1개 + 보조 프로그램 11개로 깊이와 다양성 확보

Zone A 대표: 소화기 체험 / Zone B 대표: CPR 마네킹

Zone A · 화재안전

대표 프로그램

소화기 분사 체험
실화재 상황 VR 몰입 시뮬레이션
체험 소요시간 7분, 동시 수용 4명

보조 프로그램 (11종)

완강기 탈출 체험 (5층 높이 재현)
연기 미로 통과 (가시거리 2m 이하)
화재 경보기 작동 실습
소방 호스 방수 체험
비상구 유도등 설치법 교육
화재 대피 동선 시뮬레이션
불씨 제거 모의훈련
주방 화재 질식소화 시연
전기 합선 감지 센서 체험
스프링클러 작동 원리 학습
화상 응급처치 키트 사용법

Zone B · 응급구조

대표 프로그램

CPR 마네킹 심폐소생술 실습
가슴압박 100회/분 리듬 훈련
체험 소요시간 5분, 동시 수용 8명

보조 프로그램 (11종)

AED 자동심장충격기 사용 실습
기도폐쇄 하임리히법 시연
응급처치 키트 구성품 교육
상처 소독 및 붕대 감기 실습
골절 부목 고정 체험
지혈법 압박 훈련
화상 냉각 처치 시연
벌레 물림 대응법
일사병 응급조치 학습
119 신고 요령 안내
응급환자 이송 자세 교육

Zone C · 재난대비

대표 프로그램

지진 체험 차량 진도 6.0 재현
건물 붕괴 시뮬레이션 VR 체험
체험 소요시간 6분, 동시 수용 6명

보조 프로그램 (11종)

대피 동선 VR 시뮬레이션
비상 물품 72시간 키트 구성
가스 중간밸브 차단 실습
침수 차량 탈출 체험
엘리베이터 갇힘 대응 교육
방독면 착용 훈련
라디오 수신 비상방송 청취
휴대용 손전등 사용법
비상식량 보관 온도 학습
대피소 위치 확인 앱 설치
가족 비상연락망 작성 실습

119 골든타임 VR 체험으로 시민이 직접 구급대원 시점에서 생명 구조 과정 경험

VR 헤드셋 10대 동시 운영 / 1회차 5분 × 12회 = 1일 600명 체험

VR 체험 시나리오 구성

시나리오 1. 가정 내 심정지

- 거실에서 가족이 쓰러진 상황
- 119 신고부터 CPR 실시까지 5분 골든타임 체험
- 구급대 도착 전 생명 유지 행동 훈련

시나리오 2. 길거리 교통사고

- 보행자 사고 목격 후 즉시 대응
- 출혈 부위 압박 및 의식 확인 절차
- 2차 사고 방지 동선 확보 훈련

시나리오 3. 산악 조난

- 등산로에서 낙상 환자 발견
- 헬기 구조 요청 및 환자 보온 조치
- 구조대 도착까지 생명 징후 모니터링

체험 후 CPR 인증서 QR코드 즉시 발급

소방재난본부 협조로 실제 구급 장비 전시 병행

운영 체계 및 장비 사양

VR 헤드셋 10대 동시 운영

- Meta Quest 3 또는 PICO 4 급 장비
- 1회차 5분 × 1시간 12회 = 1일 600명 체험
- 3일간 총 1,800명 체험 목표

체험 공간 구성

- 부스 면적 5m × 8m = 40m²
- VR 체험존 10개 칸막이 부스로 분리

· 대기 동선 + 안내 데스크 병행 배치
현장 운영 인력 배치

- VR 장비 관리 요원 2명 상주
- 체험 안내 및 CPR 인증서 발급 요원 2명
- 소방재난본부 협조 구급 장비 전시 1명
- 총 5명 운영 인력 배치하여 체험 흐름 확보
- 자동심장충격기 AED 2대
- 산소호흡기 및 응급 처치 키트


· 구급대원 유니폼 착용 체험 포토존 운영

체험 후 만족도 조사 QR코드 제공

서울소방재난본부 협조로 실제 구급대원 참여

VR 체험 공간을 구급차 내부 형태로 조성해 현장감 극대화

3m × 6m 컨테이너 부스 / 구급차 사이렌·LED 경광등 연출

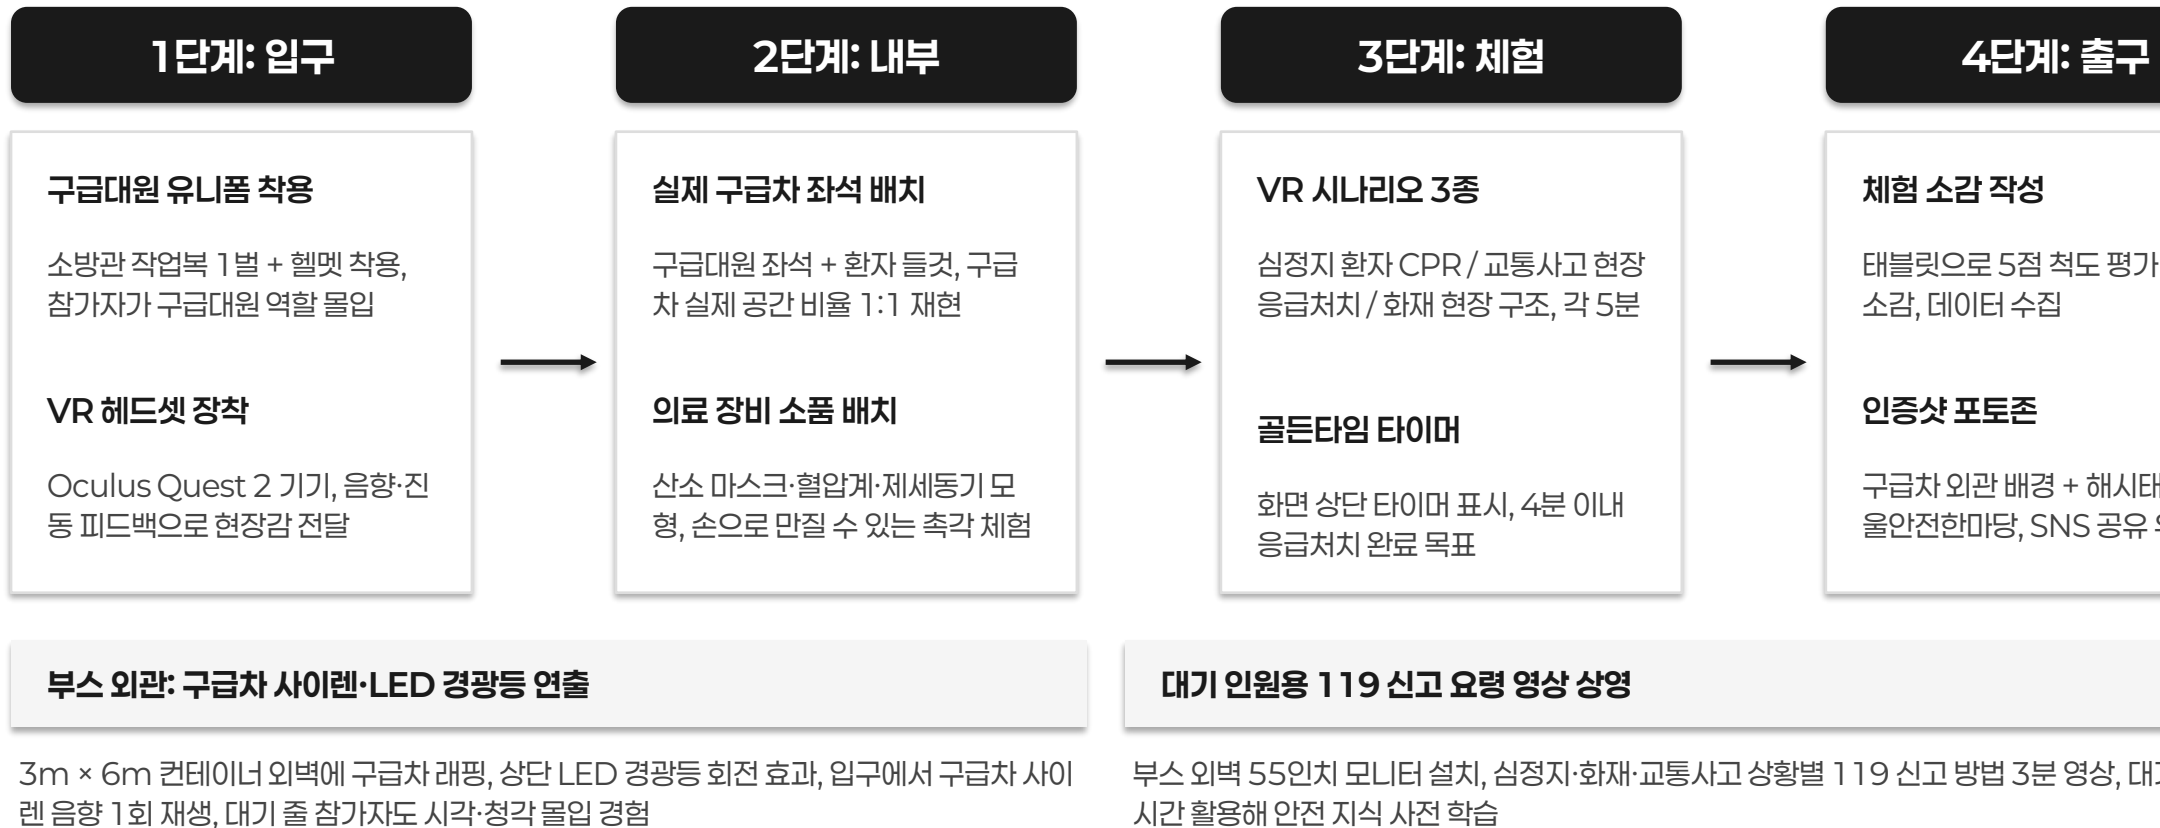

운영 시간: 9월 17일~19일 10:00~17:00 / 회당 체험 인원 1명 / 소요 시간 10분 / 1일 최대 42명 체험 가능 / 3일간 총 126명

안전 기억 아카이브 부스로 시민 제보 사연을 전시해 안전의 가치를 일상 서사로 전환

사전 공모: 7~8월 SNS 이벤트 / 현장 전시: 30개 사연 패널

사전 공모 단계 (7~8월)

공모 주제

내 삶을 바꾼 안전 순간
가족과 함께한 안전 교육 기억

제출 방식

SNS 해시태그 #서울안전한마당기억
텍스트 300자 이내 + 사진 1장

선정 기준

안전 가치 전달력 50점
일상 서사 구체성 30점
SNS 공감 지수 20점
총 100점 만점 기준 상위 30개 선정



현장 전시 단계 (9월 17~19일)

전시 형태

A1 패널 30개 세로 배치
각 패널마다 QR코드 부착해 영상 연결

현장 참여 확장

방문객이 현장에서 추가 제보 가능
포스트잇 부착 참여 공간 별도 마련
3일간 약 500건 추가 제보 목표

우수 사연 무대 연계

선정 사연 중 상위 3개를 개막식 무대에서 낭독
각 사연당 2분 낭독, 총 6분 구성

부스 공간을 타임라인 구조로 설계해

2007년부터 2026년까지 안전문화 변천사 전시

10m × 3m 갤러리형 부스 / 연도별 5개 구간 분리

2007~2010	2011~2015	2016~2020	2021~2026	2030 미래
초기 안전한마당 사진 전시 첫 개최 시민 참여자인 터뷰 영상 소방차 체험 프로그램 기록	세월호 이후 안전 인식 변화 기록 생명 존중 문화 확산 캠페인 안전 교육 의무화 제도 변천	생활안전 확산 캠페인 지하철·승강기 안전 점검 어린이 보호구역 강화	코로나 이후 방역 체계 재난 문자 시스템 고도화 K-방역 모델 확산	시민이 상상하는 2030년 안전 서울 포스트잇 참여 공간 미래 제안 아카이브

부스 구조	전시 형식	운영 인력	참여 방식
10m × 3m 갤러리형 부스 좌측부터 우측으로 시간 흐름 배치 각 구간마다 독립 조명 설치	사진 패널 20장 × A1 사이즈 영상 스크린 5개 × 43인치 참여자 제보 사연 QR 코드 연결	안내 요원 2명 상주 포스트잇 작성 유도 1명 사진 촬영 지원 1명	2030 미래 구간 포스트잇 작성 인증샷 SNS 업로드 유도 해시태그 #서울안전한마당

메인 무대·관람석·그늘막 트러스를 구조 안전성 검증 완료 후 설치

메인 무대 12m × 8m / 관람석 500석 + 입석 1,000명

메인 무대 트러스 구조

H빔 구조 + 안전 하중 3톤 확보

무대 규모 12m × 8m, 높이 1.2m 데크 구조로 음향·조명 장비 하중 3톤까지 안전 지지

트러스 프레임 H빔 400mm × 400mm

프레임 간격 2m 단위로 배치해 상부 조명 바 20개 안전 설치, 구조 진단 전문 기관 사전 검증 완료

우천·강풍 대비 와이어 보강 + 배수 시스템

강우량 시간당 20mm 이상 시 루프 트러스 탈착형 방수 천막 크레인 양쪽 지지로 무대 전체 커버, 풍속 10m/s 이상 시 와이어 8줄 보강

관람석·그늘막 트러스 구조

관람석 500석 + 입석 1,000명 수용

고정 좌석 500석을 메인 무대 정면 20m × 15m 영역에 배치, 입석 1,000명은 좌석 후방 30m × 20m 영역에 배치

그늘막 트러스 6m 높이 × 20m 폭 × 3개 설치

관람석 상부에 그늘막 트러스 3개 설치해 직사광선 차단, 트러스 간격 7m로 관람 시야 확보

구조 안전 진단 전문 기관 사전 검증 + 현장 재점검

설치 전 전문 기관에 의한 구조 안전 진단 실시, 행사 당일 오전 현장 재점검으로 볼트 체결·와이어 장력 2차 확인

여의도공원 15,000m² 행사장을 6개 Zone + 메인 무대 + 편의시설로 배치

부스 제외 수용 면적 15,000m² / 동시 수용 3,400명

메인 무대 및 LED 스크린

무대 규격 12m × 8m, LED 스크린 10m × 6m 중앙 배치
개막식 릴레이 토치 점화 및 공연 프로그램 진행 공간

관람석 및 VIP 대기실

관람석 15m × 15m, 좌석 150석 배치
VIP 대기실 6m × 4m 무대 좌측 배치, 출연자 대기실 남녀 구분

Zone A 화재안전

부스 17개, 5m × 5m 텐트 배치
소화기 체험, 완강기 탈출, 화재 VR 시뮬레이션
무대 전면 좌측 배치로 접근성 확보

Zone B 생활안전

부스 15개, 5m × 5m 텐트 배치
승강기 안전, 어린이 놀이시설, 가스 점검
가족 단위 방문객 집중 동선

Zone C 교통안전

부스 12개, 5m × 5m 텐트 배치
음주운전 체험, 자전거 안전, 어린이 보호구역
무대 전면 우측 배치로 동선 분산

Zone D 응급안전

부스 13개, 5m × 5m 텐트 배치
심폐소생술, 자동심장충격기, 119 골든타임 VR
의료 대응 시설과 인접 배치

Zone E 자연재난

부스 11개, 5m × 5m 텐트 배치
지진 체험, 풍수해 대비, 산불 진화
우천 시 실내 전환 가능 구조

Zone F 안전 아카이브

부스 12개, 5m × 5m 텐트 배치
시민 제보 사연 전시, 역대 행사 아카이브
무대 후면 배치로 관람 동선 확보

편의시설 배치

화장실 10개소, 식수대 15개소, 구호소 3개소 전역 배치
수유실 2개소, 분실물 센터 1개소 중앙 운영

비상 대피로 확보

4방향 비상 대피로 각 3m 폭 확보
유도 표지판 20개소 배치, 운영 요원 상시 대기

[3D 공간조성 연출컷 자리]

메인 무대 3D 조감도 / Zone 배치 3D 레이아웃 / 야간 조명 연출 3D 시뮬레이션

디자이너 작업 영역
풀컬러 3D 공간 조성 시안 자리

[3D 공간조성 연출컷 자리]

관람석·그늘막 3D 구조도

부스 내부 3D 투시도

전체 행사장 3D 버드뷰

디자이너 작업 영역

[3D 공간조성 연출컷 자리]

VR 체험 부스 3D 내부도 / 아카이브 갤러리 3D 동선 / 비상 대피로 3D 시뮬레이션

디자이너 작업 영역

사전 예약·현장 대기·안전 동선을 통합 관리하는 3-Track 시스템

예약 시스템: 30분 단위 회차 / 현장 대기: 실시간 혼잡도 표시

Track 1. 사전 예약 시스템

온라인 플랫폼 8월 오픈

30분 단위 회차 운영, 회차별 정원 30명으로 동시 입장 인원 분산

회차별 예약 현황 실시간 공개

예약 완료 시 QR 코드 SMS 자동 발송, 현장 입장 시 QR 스캔으로 본인 확인

예약 취소 시 자동 대기 순번 채움

취소 발생 즉시 대기자에게 알림 발송, 10분 내 미응답 시 다음 순번으로 자동 이동

카카오톡 자동응답 채널 연동

예약 안내, 회차 조회, 취소 절차를 24시간 자동 응답으로 지원

Track 2. 현장 대기 관리

QR 체크인 부스 운영

현장 방문객은 입구 QR 체크인 후 대기 번호 SMS 수신, 순번 대기 시간 안내

실시간 혼잡도 전광판 표시

Zone별 현재 인원, 예상 대기 시간을 LED 전광판 3개소에 5분 단위 갱신 표시

대기 구역 그늘막 설치

대기 인원 30명 수용 가능한 그늘막 트러스 2개소, 의자 60석 배치

순번 호출 안내 방송

입장 가능 순번을 현장 스피커로 안내, SMS 동시 발송으로 중복 알림

Track 3. 안전 동선 설계

입장·퇴장 동선 분리

입구 3개소, 출구 2개소로 물리적 분리, 바리케이드로 역류 방지

20m 간격 안전 요원 배치

행사장 전역 안전 요원 총 18명 배치, 혼잡 구역 실시간 모니터링 후 즉시 유도 방송

CCTV 15대 실시간 관제

행사장 주요 동선 15개소 CCTV 설치, 관제 센터에서 실시간 영상 확인 후 밀집 구역 즉시 대응

비상 대피 경로 안내판 설치

Zone별 비상구 방향 안내판 12개소, 야간 식별용 LED 조명 부착

총 120명 운영 인력을 4개 파트로 분리해 책임 영역 명확화

안전 파트 40명 / 운영 파트 50명

안전 파트 (40명)	
안전 요원	30명 (무대·Zone별 배치)
의무 요원	5명 (응급구조 자격 보유)
관제 요원	5명 (종합상황실 운영)

운영 파트 (50명)	
Zone별 매니저	6명 (Zone당 1명)
진행 요원	30명 (부스·무대 진행)
안내 요원	14명 (입구·인포 운영)

기술 파트 (20명)	
무대·조명·음향	15명 (전문 기술 인력)
전기·발전	5명 (발전기 상주 점검)

지원 파트 (10명)	
청소 요원	10명 (순회 청소)
식음료 지원	5명 (스텝 간식 운영)

운영 인력 사전 교육 2회 실시 (D-7 / D-1)

각 파트별 책임자가 Zone 배치도·비상연락망·매뉴얼을 숙지하고 현장 리허설 진행해 당일 즉시 대응 체계 확립

가족 단위 방문객 편의를 위한 수유실·휴게소·분실물 센터 운영

수유실 2개소 / 휴게소 3개소

수유실 운영 방안

설치 위치 및 규모

여의도공원 행사장 내 2개소 운영, 몽골텐트 1동당 5m×5m 규모로 가족 단위 방문객 집중 동선에 배치

기본 시설 구비

수유 전용 의자 2개, 기저귀 교환대 1개, 에어컨 1대, 손 세정제, 냉온수기, 전자레인지, 기저귀 수거함, 쓰레기통 각 1개씩 비치

프라이버시 보호 및 운영

텐트 내부 가림막 설치로 외부 시선 차단, 자원봉사자 1명 상주로 이용 안내 및 청결 관리, 2시간마다 소독제 살균

휴게소 운영 방안

설치 위치 및 규모

메인 무대 주변 및 Zone 입구 3개소에 그늘막 트러스 설치, 각 휴게소당 벤치 6~8개 배치로 총 20개 이상 확보

편의 시설 연계

각 휴게소 5m 이내 식수대 배치, 무더위 대비 쿨링존 미스트 분사기 설치, 우천 시 비닐 커버 즉시 씌움

청결 관리 체계

환경미화원 2명이 1일 3회 순회 청소, 16:00·19:00·21:00 쓰레기통 점검 및 수거, 벤치 주변 쓰레기통 20개 배치로 쾌적함 유지

분실물·종합안내 센터

본부석 내 일원화 운영

분실물 센터와 종합안내소를 본부석 내 통합 배치로 효율적 현장 업무 구성, 미아보호소 역할 대행

분실물 접수 및 처리 절차

신고 접수 → 관리대장 기록 → 방송 안내 → 신분 확인 후 인계, 미인수 물품은 행사 종료 후 서울시 인계

안내 서비스 및 물품 대여

안내도우미 2명 상주로 리플릿 배부 및 즉석 이벤트 운영, 휠체어 5대·유모차 5대 무료 대여

장애인 편의 시설: 경사로 5개소 설치로 휠체어 동선 확보, 장애인 화장실 2개소 운영, 점자 안내판 3개소 배치

우천·강풍 4단계 매뉴얼로 평시부터 위험까지 상황별 즉시 대응

평시 → 주의 → 경계 → 위험

1단계 평시	2단계 주의	3단계 경계	4단계 위험
강수량 5mm 미만 풍속 10m/s 미만 기상청 API 1시간 단위 연동, 현장 풍속계 실시간 모니터링, 무대 바닥 점검, 방수포 대기, 전기 시설 안전 확인, 배수로 점검	강수량 5mm 이상 풍속 10m/s 이상 그늘막 와이어 보강, 안내 방송 송출, 음향 콘솔 방수 커버 즉시 설치, 참가자 우의 지급, 미끄럼 방지 패드 바닥 배치	강수량 10mm 이상 풍속 15m/s 이상 야외 부스 일시 중단, 실내 Zone 전환 안내, 감전 위험 구역 차단막 설치, 구조물 낙하 대비 점검, 파라솔 철거	강수량 20mm 이상 풍속 20m/s 이상 행사 전면 중단, 4방향 대피로 가동, 안전요원 배치 하에 순차 귀가, 몽골텐트 내부 전원 대피, 당일 행사 취소

판단 기준: 기상청 API + 현장 풍속계 + 강수량 측정기 3중 확인 체계

우천 대응 조치

행사 1주일 전부터 기상청 예보 실시간 모니터링 가동, 주의 단계 진입 시 종합 상황실에 즉시 보고, SNS 및 SMS 문자로 참가자 안내, 취소 판단은 주최 측과 협의 후 최종 결정, 비대면 전환 가능 시 온라인 프로그램 추가 진행

강풍 대응 조치

순간 풍속 15m/s 대비 모래주머니 4포인트 고정, 무대 트러스 내풍 설계 검증 완료, 파라솔 및 배너 전량 철거, 간이 구조물 낙하 방지 순찰 강화, 참가자 텐트 타프 스트링 추가 고정

비가 와도 행사 중단 없이 실내 체험존으로 즉시 전환하는 유연 구조

실내 Zone 3개소 사전 확보 / 전환 소요 시간 15분 이내

실내 Zone 사전 확보

Zone A: 여의도 IFC몰 이벤트홀

면적 500m², 수용 인원 800명

VR 체험·안전 기억 아카이브 부스를 실내 공간으로 이전 배치, 행사장에서 도보 3분 거리로 즉시 동선 연결 가능

Zone B: 여의도 한강공원 관리사무소

면적 300m², 수용 인원 500명

어린이 안전 체험 프로그램 중심 Zone, 가족 단위 방문객 우선 안내, 행사장 직결 통로로 이동 동선 최단화

Zone C: 이동식 대형 텐트 3동

각 100m², 총 300m², 수용 인원 600명

행사장 내부 설치로 이동 거리 0m, 우천 시 지붕 보강 완료 후 즉시 운영 재개, 바닥 방수 처리로 침수 방지

전환 프로세스 (15분 이내)

STEP 1. 방송 안내 (0~3분)

강수량 30mm/h 이상 감지 시 메인 무대 스피커로 실내 Zone 위치 안내 방송 즉시 송출, 운영 요원 120명 전원에게 무전기로 전환 개시 신호 동시 전달

STEP 2. 실내 동선 유도 (3~8분)

각 부스별 운영 인력이 참가자를 가장 가까운 실내 Zone으로 유도, X배너 20개를 실내 Zone 입구에 사전 배치해 경로 표시, 우의 500벌 현장 배포

STEP 3. 체험 재개 (8~15분)

실내 Zone에 VR 기기·아카이브 패널·어린이 체험 도구 이전 배치 완료, 운영 인력이 각 Zone에서 프로그램 즉시 재개, 참가자 대기 시간 0분 목표

STEP 4. 야외 재개 판단 (우천 종료 후)

강수량 10mm/h 이하로 감소 시 야외 Zone 안전 점검 후 30분 이내 재개, 바닥 물기 제거 후 운영 재개 방송

IV **홍보 마케팅**

홍보 전략과 확산 방안

6월 기반 조성부터 9월 본홍보까지 3단계 로드맵으로 인지도 확산

1단계: 6월 기반 조성 / 2단계: 7~8월 사전 홍보 / 3단계: 9월 본홍보

1단계 · 6월 기반 조성

언론 보도자료 배포

서울시청 기자실 30개 매체 대상 배포, 안전문화행사 취지 강조

25개 자치구 협력 MOU

구청 홈페이지·전광판 활용 사전 홍보 협력 체계 구축

2단계 · 7~8월 사전 홍보

SNS 이벤트 2종 오픈

안전 기억 아카이브 공모, 인증샷 이벤트로 참여 유도

사전 예약 오픈 + 티저 영상

8월 1일 공식 홈페이지 예약 시스템 가동, 30초 티저 유튜브 배포

3단계 · 9월 본홍보

오프라인 집중 노출

현수막 80개소, X배너 40개소, 포스터 300부 배치

포털 배너 광고

네이버·다음 메인 배너 1주간 송출

홍보 수단별 강도 조절 원칙

언론 홍보 (Press Release)

6월 보도자료 배포, 9월 17일 개막식 현장 취재 지원, 9월 19일 결과 보도자료 재배포

온라인 홍보 (On-line Release)

7월 SNS 이벤트 2종, 8월 티저 영상, 9월 실시간 콘텐츠 생산 및 해시태그 캠페인

오프라인 홍보 (Off-line Release)

6월 자치구 MOU 체결, 9월 현수막·X배너·포스터 집중 배치, 현장 포토존 운영

언론 보도자료 배포와 25개 자치구 협력 MOU로 홍보 기반 구축

보도자료 3회 배포 / 자치구 MOU 25개소

언론 보도자료 배포 (3회)

보도자료 ① 행사 개요 발표

6월 초 배포. 행사명, 일자 (2026. 9. 17~19), 여의도공원, 참여 규모 3,400명 발표. 중앙 일간지 3개사 (조선, 중앙, 동아) 포함 총 12개 언론사 배포.

보도자료 ② 추가 프로그램 공개

6월 중순 배포. 119 골든타임 VR 체험, 안전 기억 아카이브 부스 상세 공개. 시민 체험 사전 예약 안내. 지역 언론사 및 문화부 출입 기자 대상 배포.

보도자료 ③ 개막식 VIP 참석 확정

6월 말 배포. 서울시장, 소방청장, 안전 관련 기관장 참석 확정 발표. 개막 퍼포먼스 (릴레이 토치 점화) 시나리오 일부 공개. 현장 프레스룸 운영 안내.

25개 자치구 협력 MOU

자치구청 홈페이지 배너 게재

서울시 25개 자치구와 MOU 체결 (6월 첫째 주 완료). 각 구청 홈페이지 메인 배너 2주간 노출 (6월 중순~말). 배너 클릭 시 행사 공식 사이트 연결. 예상 노출 12만 건.

주민센터 포스터 300개소 배치

25개 구 주민센터 (구당 평균 12개소) 총 300개소에 A2 포스터 배치. 안전 기억 아카이브 사연 공모 QR 코드 삽입. 가족 단위 방문객 타겟 유도.

구청 SNS 교차 홍보

자치구 공식 SNS (페이스북, 인스타그램) 행사 게시물 공유. 구청 공식 계정 팔로워 총 35만 명 도달 예상.

SNS·포털·유튜브를 통합 운영해 2030 타겟 유입 확대

인스타그램 릴스 10개 / 유튜브 숏폼 5개

인스타그램

- 해시태그 캠페인 #서울안전한마당 #119골든타임 #빛을지키는순간 3종 운영
- 릴스 콘텐츠 총 10개 제작, VR 체험 미리보기 15초×5개, 소방관 인터뷰 30초×5개
- 인증샷 이벤트 참여자 중 매일 10명 추첨해 소방 캐릭터 굿즈 증정
- 팔로워 목표 3,000명, 행사 기간 중 릴스 도달 15만 건, 해시태그 누적 게시물 500건 달성

유튜브

- 숏폼 콘텐츠 총 5개 제작, VR 체험 몰입 영상 60초×3개, 소방관 일상 인터뷰 90초×2개
- 서울안전한마당 공식 채널 개설 후 구독자 목표 1,500명, 조회수 누적 5만 건
- 소방청·서울시 유관기관 채널과 협업 콘텐츠 공유로 도달 확산
- 행사 종료 후 하이라이트 영상 3분 제작, 유튜브·인스타 동시 업로드로 사후 홍보 지속

네이버·다음 포털

- 네이버 블로그 공식 채널 개설, 체험 프로그램 상세 소개 콘텐츠 총 10편 발행
- 네이버·다음 메인 배너 광고 3일간 집중 노출, 클릭당 평균 800원 단가로 총 3,000회 클릭 목표
- 사전 예약 시스템과 연계해 배너 클릭 시 즉시 예약 페이지로 이동
- 검색 최적화로 '서울 안전 체험', '119 골든타임', '여의도 축제' 키워드 상위 노출 유지

안전 기억 아카이브 공모를 SNS 이벤트로 연계해 참여 유도

공모 기간: 7~8월 2개월 / 참여 목표: 500건

사전 이벤트 (7~8월)

안전 기억 아카이브 공모

인스타그램에 #내안전순간 해시태그와 함께 사연 업로드. 소방·재난·응급 상황에서 안전을 지킨 순간을 사진 또는 텍스트로 제보. 선정 기준은 좋아요 수 30% + 심사위원 평가 70%.

참여 방법: 인스타그램 공식 계정 팔로우 후 해시태그 필수 포함

사전 등록 이벤트

SNS 링크를 통해 행사 사전 등록 완료 시 추첨을 통해 소방 안전 키트 30개 증정. 등록자 중 우수 사연 3명은 개막식 VIP 초대권 제공.

경품: 소방 안전 키트 (소화기·구급약·비상식량) 30개

현장 연계 (9월 17~19일)

현장 인증샷 이벤트

행사장 방문 후 체험 프로그램 참여 인증샷을 개인 SNS에 업로드하고 종합 안내소에서 확인 받으면 즉석 경품 증정. 해시태그 #서울안전한마당2026 필수.

경품: 안전 굿즈 (반사 팔찌·비상등·손전등) 200개

아카이브 부스 전시 연계

공모를 통해 선정된 우수 사연 30건을 현장 안전 기억 아카이브 부스에 전시. 제보자 이름과 함께 타임라인 구조로 배치해 시민 안전 서사를 시각화.

전시 위치: 안전 기억 아카이브 부스 (Zone 6)

퀴즈 이벤트

현장 QR 코드를 통해 안전 상식 퀴즈 참여 후 정답자에 한하여 추첨으로 경품 증정.

참여 목표 500건 달성 시 추가 이벤트로 우수 사연 작성자 3명에게 소방서 1일 체험권 제공. 사후 이벤트는 행사 종료 후 블로그·SNS 방문 후기 작성 시 추첨으로 안전 키트 10개 증정.

현수막·X배너·포스터를 서울 주요 거점 300개소에 집중 배치

현수막 50개 / X배너 100개 / 포스터 150개

현수막 50개

설치 위치

25개 자치구청 현관 앞 가로등
지하철 2호선·5호선·9호선 역사 25개소 출입구

설치 시기

2026. 8. 20.(수)부터 행사 종료일까지 30일간

규격 및 내용

가로 500cm × 세로 90cm 천 원단
행사명·일자·장소·QR코드 4대 정보 인쇄

X배너 100개

설치 위치

여의도 인근 오피스 빌딩 로비 50개소
한강공원 여의도·양화·이촌·뚝섬 입구 50개소

설치 시기

2026. 9. 1.(월)부터 행사 종료일까지 19일간

규격 및 내용

가로 60cm × 세로 180cm 알루미늄 프레임
사전 예약 QR코드 즉시 연결 유도

포스터 150개

설치 위치

25개 자치구 주민센터 게시판 100개소
서울시 공공도서관 안내 데스크 50개소

설치 시기

2026. 8. 15.(토)부터 행사 종료일까지 35일간

규격 및 내용

A2 사이즈 420mm × 594mm 아트지
주요 프로그램 6개 Zone별 이미지 배치

티저·메이킹·하이라이트 3종 영상으로 사전부터 사후까지 지속 노출

티저 영상 1분 / 메이킹 영상 3분 / 하이라이트 영상 5분

티저 영상 (1분)	메이킹 영상 (3분)	하이라이트 영상 (5분)
공개 시점 2026년 7월 중순 주요 내용 릴레이 토치 점화 예고편, 개막식 무대 조명 일부 공개, 행사 일자 강조 타이포그래피	공개 시점 2026년 8월 중순 주요 내용 119 골든타임 VR 체험 제작 과정, 부스 설치 타임랩스, 안전 기억 아카이브 준비 현장	공개 시점 행사 직후 (9월 말) 주요 내용 개막식 릴레이 토치 점화, 6개 Zone 체험 현장, 시민 참여 인터뷰, 전체 행사 몰입 구간

배포 채널

유튜브 (서울시 공식 채널 우선 업로드 후 자체 채널 확산), 서울시 홈페이지 메인 팝업, 인스타그램·페이스북 릴스·피드, 25개 자치구 홈페이지 공유 링크, 행사장 메인 무대 LED 스크린 실시간 상영

영상 규격

1920×1080 MP4 (유튜브 업로드용), 썸네일 별도 제작	메인 무대 상영용은 4K (3840×2160) 별도 변환
-------------------------------------	---------------------------------

현장 참여자를 SNS 홍보 주체로 전환하는 인증샷·해시태그 캠페인

포토존 5개소 / 인증샷 이벤트

포토존 5개소 위치 선정

① 메인 무대 앞 대형 서울시 BI 화분 구역

릴레이 토치 점화 순간을 배경으로 세대별 참여자 단체 촬영, 개막식 이후 자유 촬영 개방

② 119 골든타임 VR 체험 부스 입구

구급차 형태 외관과 VR 헤드셋 착용 모습 촬영, 체험 대기 시간 활용 인증샷 유도

③ 안전 기억 아카이브 갤러리 내부

2007년부터 2026년까지 타임라인 벽면 전시물 앞, 본인 제보 사연 발견 시 인증 촬영

④ 야간 조명 설치 구역 (여의도공원 산책로)

18시 이후 점등되는 안전 테마 조명 아래 야경 촬영, 가족 단위 방문객 집중 유입 예상

⑤ 릴레이 토치 전시 부스

인증샷 해시태그 이벤트 운영

이벤트 참여 방법

포토존 5개소 중 1곳 이상에서 촬영 후 개인 SNS(인스타그램·페이스북·트위터)에 #서울안전한마당 해시태그와 함께 게시물 업로드

경품 추첨 및 지급

행사 종료 후 해시태그 게시물 중 추첨, 안전 키트(소화기·구급함·손전등 세트) 50개 + 스타벅스 아메리카노 기프티콘 100개 증정, 당첨자 개별 DM 발송

참여 게시물 2차 활용

행사 후 수집된 인증샷 게시물을 온라인 갤러리로 재편집, 서울시 안전 홈페이지 내 전시하여 참여자 재방문 유도 및 차년도 홍보 자료로 활용

현장 안내 및 참여 독려

각 포토존에 X배너 설치, QR코드로 해시태그 복사 편의 제공, 운영 요원 1명씩 배치하여 촬영 지원



사업 관리

일정·조직·안전 관리

착수부터 산출물 제출까지 5개월을 6단계로 분리해 마일스톤 관리

착수: 6월 / 완료: 10월

전체 로드맵을 주차별로 수립하여 빠짐없는 준비 체계 구축



착수 ~ 본 행사 전 (6월 ~ 9월 초)

W1: 착수 보고 + 홍보 계획 확정
W4: 언론 보도자료 배포 (25개 자치구)
W8: SNS 이벤트 오픈 (안전 기억 아카이브)
W12: 예약 시스템 개통 + 협력 기관 MOU
W16: 현장 설치 착수 + 구조 안전성 검증
W18: 전체 리허설 + 동선 시뮬레이션

본 행사 ~ 사후 (9월 17일 ~ 10월 30일)

D-day: 9.17 개막식 (릴레이 토치 점화)
9.17~19: 6개 Zone 운영 + 120명 인력 배치
9.20: 현장 철거 + 안전 점검
9.21~30: 만족도 설문 분석 + 언론 보도 모니터링
10.1~15: 결과 보고서 작성 (사진 500매 이상)
10.30: USB 산출물 일괄 제출

D-90부터 D+30까지 주차별 체크리스트로 지연 방지

D-90: 착수 보고 / D+30: 정산 완료

D-90~D-60	D-60~D-30	D-30~D-7	D-7~D-1	D-Day	D+1~D+30
착수 보고회 개최 업무 분장 완료 협력 기관 MOU 체결 기획안 1차 협의 발주처 피드백 수렴 프로그램 구성안 확정 주요 VIP 명단 1차 작성	온라인 예약 시스템 구축 SNS 홍보 시작 참가 신청 접수 개시 협찬사 계약 완료 디자인 시안 확정 보도자료 1차 배포 현장 사무국 설치	현장 설치 작업 착수 구조 안전성 검증 완료 100개 몽골텐트 설치 메인 무대 조립 완료 안전 대책 최종 점검 진행 요원 120명 배치 완료 보도자료 2차 배포	개막식 리허설 실시 출연진 동선 확인 VIP 명단 최종 확정 비상 대피 경로 표시 기상 악화 시나리오 점검 제작물 정위치 배치 최종 진도 점검회	9월 17일 개막식 진행 3일간 현장 운영 실시간 안전 모니터링 참가자 3,400명 수용 기상 상황 즉시 대응 현장 스케치 영상 촬영 일일 결과 보고	현장 철거 작업 완료 결과 보고서 작성 참여자 설문 취합 언론 보도 모니터링 영상 편집 완료 USB 제출물 정리 10월 30일 정산 완료

주요 점검 회의

D-60 착수 보고회: 기획안 확정, 협력 기관 MOU 체결 완료 보고

D-30 중간 점검회: 현장 설치 진행률 보고, 안전 대책 점검

D-7 최종 점검회: 리허설 결과 공유, 비상 대응 체계 확인

※ 각 단계 체크리스트를 주간 단위로 점검해 일정 지연을 사전 방지하며, 발주처 요청 시 수시 진도 보고 실시

[조직 구성도]

총괄 PM / 기획·운영·안전·홍보 파트장 / 파트별 매니저·실무자

디자이너 / 사용자가 채울 자리

- PM / 디렉터 / 실무 인원 구성
- 파트별 역할 분담 (R&R)
- 연락처 / 긴급 연락망

4개 파트가 책임 영역을 명확히 분리하고 PM이 통합 조율

기획 파트: 콘텐츠 기획 / 운영 파트: 현장 운영

기획 파트

개막식 시나리오 작성

릴레이 토치 점화 동선과 세대별 발언 순서 정리, 조명 큐시트와 영상 송출 타이밍 PM과 협의해 20분 시나리오 확정

프로그램 구성 및 협력 기관 조율

70개 부스를 6개 Zone으로 분리 배치, 서울소방재난본부·소방서·경찰서와 체험 프로그램 일정 조율

운영 파트

현장 인력 배치 및 동선 관리

총 120명 운영 인력을 6개 Zone에 20명씩 배치, 사전 예약 참가자 대기 동선과 현장 접수 참가자 체험 동선 분리 관리

편의시설 운영 및 현장 통제

수유실·휴게소·분실물 센터 3개소 운영, 우천 시 실내 체험존 전환 동선 통제, 메인 무대 관람석 정리

안전 파트

안전 매뉴얼 수립 및 현장 요원 관리

화재·지진·기상악화 3대 비상 시나리오 작성, 안전요원 30명에게 소화기·AED·대피 동선 교육 1회 실시, 응급실 연락망 확보

비상 상황 대응

홍보 파트

온·오프라인 홍보 및 SNS 운영

6월 보도자료 배포, 8월 SNS 이벤트 3회 진행, 9월 현수막 300개소 설치, 티저·메이킹·하이라이트 3종 영상 제작

현장 인증샷 캠페인 운영

설치부터 철거까지 전 단계 안전 관리로 무사고 책임

안전관리비: 순공사비 1.25% 이상 / 영업배상책임보험 가입

설치·철거 단계 안전 관리

- 시공·철거 시 각 홀에 안전관리자 배치해 실시간 위험 감독
- 고소 작업 시 안전모 착용 의무화 및 리프트 장비 사용으로 추락 방지
- 외주광장 차량 진입 시 안전 인력 배치 및 보행자 동선 분리 관리
- 설치·철거 시 각종 쓰레기 및 오물 수시 처리로 청결 유지
- 전기 설비 사용 용량 사전 체크 및 설치 전 모든 장비 점검으로 정전·화재 대비
- 설치 완료 후 시설물 안전도 점검 및 구조 검증 확인서 제출

운영 단계 안전 관리

- 각 전시구역별 20m 간격 분말소화기 배치 및 위치 표시
- 운영 요원 전원 소방 교육 이수 및 초기 진화 대응 절차 숙지
- 바닥 사인물 통한 동선 안내 및 비상구 명확 표기로 대피 경로 확보
- 운영 인력 안전 관리 교육 실시 및 관리팀장 현장 상주
- 행사장 인근 의료지원센터 및 119 비상연락망 확보, 응급실 최단거리 정보 사전 파악
- 매일 행사 오픈 전 행사장 전체 바닥 청소 및 시간대별 클리닝 진행

보험 가입: 영업배상책임보험 대인·대물 가입 및 청소 용역 별도 보험 확인

안전관리비: 순공사비 1.25% 이상 별도 편성 및 투명 집행

화재 발생 시 최초 발견자가 소화기로 1차 진화 후 즉시 대피 동선 가동

소화기 배치: 20m 간격 / 비상 연락망: 서울 중부소방서

사전 예방 체계

행사장 내 화기 사용 구역 및 흡연 구역 지정 후 소방시설 점검

소화기 20m 간격 배치, 운영·전시·편의시설 구역별 2개 이상

서울 중부소방서 회현119안전센터 사전 협조 요청 (행사장 기준 2.1km)

개장 전 일일 소방 안전 점검 및 예방 순찰 실시

비상 연락망 및 협조 체계

서울 중부소방서 회현119안전센터
위치: 행사장 기준 2.1km (여의도공원 → 중부소방서)
비상 연락: 119 직통 / 행사 개요 사전 보고 완료
현장 소방 인력 전진 배치 협조 요청

소형 화재 발생 프로세스

1단계: 최초 발견자가 현장 배치 소화기로 초기 진화

2단계: 인근 참가자 대피 안내, 질서 있게 대피 유도 (사이렌 동시 송출)

3단계: 운영 본부 및 상황실 즉시 보고

4단계: 부상자 파악 후 현장 의무실 또는 119 연계

5단계: 화재 구역 소화 후 전 구역 안전 점검 실시

대형 화재 발생 프로세스

1단계: 즉시 119 호출 및 행사 중단

2단계: 대피 안내 방송, 운영 인력 대피 동선 배치

3단계: 질서 있게 참가자 대피 유도 (사이렌 동시 송출)

4단계: 소방 인력 소화 작업, 운영 본부 및 상황실 보고

5단계: 부상자 파악, 화재 구역 및 주변 안전 점검 실시

행사장 내 임시 119 안전 센터 운영
운영 본부 및 종합 상황실 실시간 보고 체계
자위 소방대 50명 내외 편성 (조직위, 대행사)
화재 특별 경계 근무 실시

지진 발생 시 운영 요원이 참가자를 탁자 아래로 유도해 몸 보호

운영 매뉴얼 숙지 / 대피 동선 사전 확보

1단계 초동 대응	2단계 대피 유도	3단계 집결 관리	4단계 상황 보고
지진 발생 즉시 운영 요원이 참가자에게 탁자 아래 대피 지시 머리 보호 안내, 창문·출입문에서 멀어지도록 유도 부스 부착물 낙하 위험 구역 즉시 통제	흔들림 멈춘 후 건물 밖으로 신속 대피 질서 유지하며 각 출입문에서 가장 가까운 안전 구역으로 이동 안전 요원은 출입문 전체 개방, 고정	여의도공원 중앙 공터로 전체 참가자 집결 인원 점검, 부상자 확인 즉시 진행 2차 여진 대비 행사장 재진입 통제	PM이 발주처 담당자에게 즉시 상황 보고 시설 안전 점검 완료 후 재개 여부 판단 119 신고, 부상자 발생 시 협력 병원 이송
운영 매뉴얼 사전 숙지 체계		비상 연락망 및 협력 체계	
전 운영 인력 120명 대상 착수 후 1주 이내 안전 교육 실시 지진 대응 매뉴얼 A4 1장 요약본 배포, 전원 숙지 확인 리허설 시 지진 시뮬레이션 진행, 대피 동선 실제 점검 각 Zone 책임자가 출입문 위치, 집결 지점 사전 파악		119 영등포소방서 여의도119안전센터 즉시 신고 체계 구축 PM 핸드폰에 발주처 담당자 직통번호 단축 등록 협력 병원 강북삼성병원(종로구 새문안로 29) 최단 거리 확보 현장 안전 요원 무전기 24시간 개통, PM 실시간 보고	

주변 응급 시설 연락망 확보 및 최단 거리 응급실 정보 사전 파악

응급실 위치: 강북삼성병원 / 거리: 여의도공원에서 3.2km

현장 의무실 운영

- 위치: 여의도공원 메인 무대 우측 15m 지점
- 인력: 간호사 2명 상주 (9. 17. ~ 9. 19. / 3일간)
- 운영 시간: 09:00 ~ 21:00 (행사장 개장 시간 연동)
- 응급 키트 구비 내역: 소독약·밴드·붕대·지혈제·냉찜질팩·심폐소생기 (AED)·산소호흡기·체온계·혈압계
- 표지판 설치: 현장 내 6개 Zone 입구마다 의무실 위치 안내판 부착 (A2 크기 · 야광 반사판)

응급 환자 이송 체계

- ① 경증 (찰과상·타박상·어지럼증): 현장 의무실에서 간호사 1차 처치 후 귀가 안내
- ② 중증 (골절·출혈·의식 소실·호흡 곤란): 즉시 119 신고 후 강북삼성병원 응급실로 이송 (차량 3.2km · 약 8분 소요)
- ③ 긴급 후송 차량: 현장 운영본부 차량 1대 대기 (09:00 ~ 21:00 상시 배치) · 소방도로 확보
- ④ 비상 연락처: 강북삼성병원 1599-8114 (응급실 직통)

행사장 보안 및 안전을 위한 지원 인력 투입과 정보 유출 방지 서약

경비 인력: 야간 2일 + 행사 중 15명 / CCTV: 15대 실시간 모니터링

경비 인력 투입 체계		
구분	인원	운영 내용
설치 기간 야간 경비	2명 × 2일	장비 반입 시점부터 24시간 순환 근무
행사 기간 주간 경비	15명 × 3일	출입구 5명, 주요 동선 6명, 야외무대 4명 배치
행사 기간 야간 경비	3명 × 2일	9월 17일, 18일 야간 시설물 보호 순찰
철거 기간 주간 경비	2명 × 1일	장비 반출 시 도난 방지 경비

CCTV 실시간 모니터링 체계	
설치 장소	대수
주출입구 2개소	4대
주요 Zone 6개소	6대
메인 무대 앞 광장	3대
야간 조명 집중 구역 2개소	2대
관제 센터 운영	
현장 PM실에 모니터 4대 설치해 15대 CCTV 영상을 4분할 실시간 확인. 이상 징후 발견 시 경비 인력에게 무전으로 즉시 출동 지시. 야간에는 CCTV 녹화본을 다음날 아침 점검해 시설물 파손, 무단 침입 여부 확인.	

비상 연락망: 서울 남대문경찰서 태평로파출소 (02-752-XXXX)

정보 보안: 협력 업체 전원 유출 방지 서약서 제출 의무화

기상·안전·운영 3대 리스크를 사전 시나리오로 대비

기상 리스크: 4단계 매뉴얼 / 안전 리스크: 화재·지진·의료

기상 리스크 대응 체계	기상 리스크 대응 체계	안전 리스크 대응 매뉴얼
평시 (강수 없음) 부스 구조물 안전점검, 기상청 실시간 모니터링, 운영 요원 배치 확인	경계 (강수량 10~30mm/h) 실외 프로그램 중단, 실내 체험존 전환 안내, 메인 무 대 공연 일시 중단	화재 진압 최초 발견자 소화기 1차 진화, 참가자 즉시 대피, 대형 화재 시 119 신고
주의 (강수량 10mm/h 미만) 실외 부스 천막 보강, 관람객 안내방송 1회, 우의 배포 준비	위험 (강수량 30mm/h 이상 또는 풍속 14m/s 이상) 행사 전면 중단, 관람객 실내 대피 유도, 구조물 철거 착수	의료 대응 응급처치요원 현장 치료, 인근 병원 후송, 응급차 대기
		지진 대응
운영 리스크 대응 시나리오	비상 상황 총괄 체계	
예약 과부하 시 현장 대기 전환 사전 예약 100% 마감 시 현장 대기 시스템 전환, 대기 번호표 발급 후 6개 Zone 분산 안내, 대기 인원 50명 초과 시 Zone 간 이동 유도	PM 직속 상황실 운영 행사장 중앙 상황실 1개소 설치, PM·파트장 4명 상주, 무전기 30대로 전 현장 연 결, 모든 상황 수집·보고·전파 일원화	
동선 혼잡 시 분산 조치 메인 무대 앞 밀집 시 Zone 5·6 추가 프로그램 안내방송, 운영요원 30명 동선 유 도	유관기관 협조 체계 영등포경찰서·소방서·인근 병원 핫라인 구축, 응급차 1대 행사장 상주	

착수·중간·최종 3회 보고로 발주처 피드백 즉시 반영

착수 보고: 6월 / 중간 보고: 8월 / 최종 보고: 9월

착수 보고	중간 보고	최종 보고
시기 계약일로부터 7일 이내	시기 8월 중순 (행사 1개월 전)	시기 9월 16일 (행사 1일 전)
주요 내용 기획안 확정, 전체 프로그램 운영 방안, 과업 조직 관리 방안, 예산 집행 계획 수립	주요 내용 홍보 진행 상황, 사전 예약 현황, 무대 설치 일정, 프로그램 섭외 완료 여부	주요 내용 현장 설치 완료 점검, 리허설 결과, 안전 점검 완료 여부, 최종 운영 매뉴얼 확정

피드백 반영 체계

수정안 제출 보고 후 7일 이내 발주처 피드백 반영한 수정안 제출, 주간 회의를 통해 세부 진행 상황 공유	긴급 소통 체계 주요 이슈 발생 시 즉시 유선 보고 후 24시간 내 서면 보고서 제출, PM 단독 권한으로 현장 즉시 대응
---	--

행사 종료 후 결과 보고서·사진·영상·제작물을 USB로 일괄 제출

결과 보고서: 10월 15일 / 정산 보고서: 10월 30일

결과 보고서 (행사 종료 후 15일 이내)

● 행사 개요 및 추진 경과

일자·장소·규모·참여 인원 집계

● 프로그램별 운영 결과

6개 Zone별 참여 인원·체험 회차·대기 시간

● 언론 보도 현황

보도자료 배포 12건·방송 노출 8회·온라인 기사 클립

정산 보고서 (사업 기간 종료일까지)

● 예산 집행 내역

7개 항목별 집행액·세부 내역·증빙 서류

● 인력 투입 현황

총 120명 운영 인력 일별 배치표·근무 일지

● 만족도 설문 결과

참여자 500명 표본 조사·만족도 점수·개선 제안

사진·영상·제작물 USB 2개 (원본 1개 + 백업 1개)

사진 (고화질 원본)

- 개막식 현장 (50장)
- 6개 Zone 체험 현장 (각 20장)
- 포토존·편의시설 (30장)
- 총 200장 이상 / JPG 300dpi

영상 (Full HD 원본)

- 개막식 풀 영상 (20분)
- 프로그램 하이라이트 (5분)
- 현장 스케치 영상 (3분)
- 1920×1080 / MP4 / 무압축

제작물 디자인 파일

- 포스터·현수막·X배너 시안
- SNS 홍보물 (10종)
- 부스 그래픽·안내판 파일
- AI / PSD / PDF 원본

총 예산 2억 4천만 원을 7개 항목으로 분리해 투명 집행

총 예산: 240,000,000원 (부가세 포함) / 안전관리비: 순공사비 1.25% 이상

항목	세부 내용	금액 (원)	비중
항목 ①	무대·그늘막 설치비 메인 무대 12m×8m, 트러스 그늘막 15개소, 관람석 300석 일체	72,000,000	30%
항목 ②	부스·텐트 설치비 몽골텐트 100개 렌탈, Zone별 안내 부스 6개소, 안전 체험 부스 70개소	60,000,000	25%
항목 ③	인력 운영비 프로젝트 디렉터 1인, 매니저 2인, 현장 운영 인력 120명 3일간 배치, 안전 요원 30명	48,000,000	20%
항목 ④	홍보·영상 제작비 티저·메이킹·하이라이트 3종 영상, SNS 광고, 현수막 300매, 포스터 5,000매	24,000,000	10%
항목 ⑤	안전 관리비 순공사비의 1.25% 이상, 구조 안전성 검증, 소방 설비 점검, 응급 의료진 배치	12,000,000	5%
항목 ⑥	보험·청소 용역비 행사 배상 책임 보험 가입, 3일간 청소 인력 20명, 분리수거 관리	12,000,000	5%
항목 ⑦	예비비 기상 악화·긴급 수리·추가 안전 조치 등 돌발 상황 대비 비용	12,000,000	5%
합계	총 예산 (부가세 포함)	240,000,000	100%

각 항목을 세부 내역으로 분리해 단가·수량을 투명 공개하고, 예산 집행 내역을 매주 발주처에 보고합니다

각 항목을 세부 내역으로 분리해 단가·수량 투명 공개

무대 설치: 12m × 8m / 그늘막 트러스: 20m × 3개

구분	항목	단가(원)	수량	단위	금액(원)
무대 설치	메인 무대 H빔 구조	12,000,000	1	식	12,000,000
	LED 스크린 12m × 8m	15,000,000	1	식	15,000,000
	조명·음향 시스템 렌탈	23,000,000	1	식	23,000,000
그늘막	트러스 6m × 20m × 3개	10,000,000	3	개	30,000,000
몽골텐트	100개 부스 설치	300,000	100	개	30,000,000
인력 운영	운영 인력 120명 × 3일	150,000	360	명일	54,000,000
홍보물	현수막·포스터·X배너	8,000,000	1	식	8,000,000
	언론 보도자료 배포	5,000,000	1	식	5,000,000
	SNS·온라인 광고	7,000,000	1	식	7,000,000
영상 제작	티저·메이킹·하이라이트	12,000,000	1	식	12,000,000
기타 경비	보험·운송·예비비	21,000,000	1	식	21,000,000
총 예산					240,000,000

※ 부가세 포함 금액 / 항목별 세부 내역은 발주처 요청 시 추가 제출

행사 종료 후 설문·언론 분석·참여자 DB를 차년도 기획 자료로 활용

설문 조사: 온라인 500명 / 언론 보도: 클리핑 50건

기록 및 결과물 수집

설문조사 결과

행사 참가자 온라인 설문 500명 대상 만족도·개선점·재참여 의향 조사 (5점 척도), 결과보고서와 USB 전달

사진 및 영상

사진 및 영상 원본 DB 수집, 행사 기록 영상물 편집본 포함 통합 파일 납품

보도자료

국내 언론 보도자료 클리핑 50건, 배포 수량 및 보도 매체 확인 포함

온·오프라인 홍보 DB

SNS 게시물, 포털 노출 기록, 홍보 콘텐츠 통합 DB 구축 후 제출

행사 종료 후 관리 계획

개최 성과 조사

행사 관련 미디어 홍보 결과 보고, 설문 결과 및 기타 기록물 수집 분석, 참여자 만족도 4.5/5.0 이상 달성 목표

홈페이지 및 SNS 관리

홈페이지 및 SNS를 통한 사후 게시물 업로드로 내년 행사의 기대감 제고, 하이라이트 영상 10월 30일까지 업로드

결과보고서 정산

실행 매뉴얼 바탕 최종 결과보고서 제작 납품, PR 데이터·기록영상물·기록사진물 동봉, 주최기관이 제시하는 증빙자료 제출, 행사 종료 후 30일 이전 정산보고서 제출

청렴계약이행서약서 제출 및 근로자 권리 보호 철저 준수

청렴계약이행서약서 제출 / 근로기준법 준수

청렴 계약 이행 서약

금품·향응 수수 금지 서약

행사 진행 관련 모든 직원이 금품, 향응, 편의 제공 일체 수수 금지 서약서 제출. 발주처 직원 및 관계자와의 부적절한 접촉 차단 체계 운영.

위반 시 계약 해지 동의

청렴서약 위반 사실 발견 시 계약 해지, 손해배상, 입찰 참가 자격 제한 등 불이익 감수 동의. 위반 행위 발견 즉시 발주처 보고.

근로자 권리 보호 준수

최저임금 및 4대보험 가입 의무

행사 운영 투입 인력 전원 2026년 최저임금 이상 지급 보장. 4대보험 가입 확인서 계약 체결 7일 이내 제출. 보험료 체납 사실 발견 시 즉시 시정.

임금 지급 관리 및 확인

매월 25일 임금 지급 원칙 준수. 임금 체불 발생 시 발주처 즉시 보고 및 14일 이내 시정. 근로계약서 사본 계약 7일 이내 제출.

용역 근로자 근로기준법 준수 확인서 제출

근로기준법 제17조 준수 확인서

용역 근로자 근로계약서 작성 의무 이행 확인서 계약 체결 후 7일 이내 제출. 근로 시간, 휴게시간, 휴일, 임금 등 법정 기재사항 누락 없이 작성. 근로자 1인당 근로계약서 1부씩 제출.

투명한 예산 집행 및 정산 보고

예산 내역 공개 및 정산서 제출

총 예산 2억 4천만 원을 7개 항목으로 분리한 세부 내역 공개. 각 항목별 단가, 수량, 금액 투명 공개. 행사 종료 후 10일 이내 정산 보고서 및 증빙 서류 일체 제출.

3일간 3만 명 참여로 시민 안전 감수성 확산 및 서울시 안전 문화 선도

참여 목표: 3만 명 / 만족도 목표: 4.5/5.0

정량 효과

3만

70개 부스 × 3일간 운영
체험 연인원 3만 명 목표
1일 평균 1만 명 방문 예상

50건+

주요 언론 보도 예상
조선·중앙·동아·한겨레·MBC·KBS

정성 효과

안전 기억 아카이브로 시민 서사 확산
3일간 수집된 시민 제보 사연 200건 이상을 온라인 아카이브로 전환해 차년도까지 지속 노출

안전문화 일상 전환 계기 마련
체험을 넘어 기억으로 남는 구조 설계로 참여자가 일상에서 안전 행동을 실천하는 문화 형성

지속 효과

차년도 재참여 의향 70% 이상 목표
현장 만족도 설문과 SNS 피드백을 분석해 차년도 기획에 반영

서울시 안전 문화 선도 도시 이미지 구축
19년 역사 축적과 3만 명 규모 무사고 운영

파급 효과

SNS 해시태그 도달 10만 건 예상
인증샷·참여 후기가 2030 타겟 유입 확대에 이어지는 선순환 구조

자치구 협력 모델 확산
25개 자치구와 MOU 기반으로 지역 안전문화 연계

참여 인원·만족도·언론 보도·SNS 도달을 4대 KPI로 설정

KPI ①: 참여 인원 3만 명 / KPI ②: 만족도 4.5/5.0

정량 목표 4대 지표

3만

명

참여 인원
1일 평균 1만 명
3일간 총 3만 명

4.5/5.0

0

만족도
온라인 설문 500명
행사 종료 후 1주

50건

언론 보도

주요 일간지 20건
방송 보도 30건

100만

명

SNS 도달
인스타그램 60만 명
유튜브 40만 명

홍보 채널별 세부 목표

- 온라인 보도자료 100건 이상 배포
- 주요 방송사 네트워크 보도 6건 이상
- 유튜브 인플루언서 협업 영상 2건 이상
- 인스타그램 광고 집행 15일 이상
- 옥외광고 주요 거점 20개소 게시
- LED 전광판 광고 30일 이상 송출
- 홈페이지 제작 후 1년 이상 유지 운영
- 현수막 25개 자치구 300개소 게시

19년 역사의 서울안전한마당을 무사고로 열어내고 시민 안전 문화를 일상에 뿌리내리겠습니다

세 세대가 이어받은 빛

2007년부터 2026년까지 시민 3만 명이 매년
참여한 안전문화 확산의 장

가족 단위 체험 프로그램 70개 부스로 어린이부
터 어른신까지 세대 연결

개막식 릴레이 토치로 조부모, 부모, 자녀 세 세대
가 안전 의지를 무대 위에서 접화

빛을 지키는 순간들

VR 119 골든타임 체험으로 시민이 직접 생명 구
조 순간을 경험

안전 기억 아카이브 부스로 시민 사연을 타임라인
전시로 전환

우천 시 실내 체험존 즉시 전환으로 행사 중단 없
이 3일 연속 운영 지속

서울의 안전을 밝힙니다

평시부터 위험까지 4단계 기상악화 매뉴얼로 강
수량 30mm/h 이상 시 즉시 대응

화재, 지진, 의료 비상 시나리오 사전 점검으로
120명 운영 인력 책임 명확화

여의도공원 15,000m² 공간에 6개 Zone 분리
로 동선 혼잡 방지와 무사고 책임

2026. 9. 17.(목) ~ 9. 19.(토) 3일간 여의도공원에서 열리는 서울안전한마당을 시민 안전 문화가 일상에 뿌리내리는 여정으로 완성하겠습니다

제출 서류 일람

1. 직접생산확인증명서

제조사 발급 직접생산확인증명서 또는 제조사 직접생산 확인서
부가세법 시행령 제62조에 따른 증빙 서류 제출

2. 영업배상책임보험증권

대인 1사고당 1억 원 이상, 대물 1사고당 5천만 원 이상 보장
행사 기간 전체 유효 기간 포함 증권 제출

3. 중소기업확인서

중소기업기본법 제2조에 따른 중소기업 해당 여부 확인서
중소벤처기업부 또는 중소기업중앙회 발급 증빙 제출

제출 기한 및 방법

계약 체결 후 7일 이내 발주처 담당자에게 원본 1부, 사본 1부 제출

감사합니다

2026년 서울안전한마당 행사 대행 용역 제안서

빛을 지키는 순간들, 시민과 함께 만들어가겠습니다
