
행사 대행 용역 정성 제안서

2026 위드펫스타

제2회 동물보호의 날 축제

사람과 반려동물이 함께 머무는 친화도시 축제

발주 부산광역시

행사 일자

2026.10.3.(토) ~ 10.4.(일) (2일간)

행사 장소

화명생태공원 일원

CONTENTS

제안의 전체 흐름

화명생태공원 잔디광장
약 17,000m²

2026.10.3.(토) ~ 10.4.(일)
2일간

I

제안 개요

사업 이해, 과업 범위, 컨셉, 기대효과

II

추진계획

사업총괄, 세부실행, 안전관리, 홍보

III

사업관리

추진일정, 품질 및 리스크, 사업비

IV

기획구성 및 행사운영

공간 연출, 참여 설계, 현장 운영 역량

V

홍보 및 사업비

확산 성과, 청렴 준수, 수행 의지



제안 개요

동물보호에서 **복지로의 대전환**을 시민 일상에 새기는 축제

행사기간 2026.10.3 ~ 10.4 (2일) , 행사장 화명생태공원 약 17,000m²

지금까지의 시선


보호 중심의 시선

유기, 학대 방지에 무게를 둔 관리 중심 접근. 시민은 정책의 대상으로만 머무는 구조

단기 이벤트로 끝나는 기념일

반려인만 모이는 닫힌 행사

행사 당일의 일회성 메시지로 그쳐 일상으로 이어지지 못하는 한계



이번 축제가 만드는 전환

복지와 공존의 시선

동물보호의 날 10.4 지정 의미를 시민 체험으로 확산. 보호를 넘어 함께 사는 복지로 이행

축제 2일을 친화도시 365일로 연결

반려인과 비반려인이 함께하는 열린 축제

반려동물 친화도시 부산의 이미지를 화명생태공원 현장에서 시민 일상으로 각인

보는 행사에서 함께 사는 일상으로, 동물복지를 시민의 기억에 새기는 2일의 여정

기획에서 조성, 운영, 안전, 사후까지 있는 **통합 수행 범위**

부스시설 몽골텐트 100동, 캐노피 20동, 의자 1,500개, 테이블 200개 내외

착수일부터 2026.10.30.(금)까지, 화명생태공원 잔디광장 약 17,000m²를 6개 영역으로 분담해 빈틈 없이 수행

01 기획 설계

행사 기본계획과 세부 실행계획 수립, 운영 매뉴얼 작성, 예산 편성과 물자 발주 계획 확정

02 행사장 조성

잔디광장 약 17,000m² 기능별 구획, 몽골 텐트 100동과 캐노피 20동, 의자 1,500개 설치

03 프로그램 운영

2026.10.3.~10.4. 이틀간 메인무대, 체험존, 부스 운영, 현장 사무국과 콜센터 동시 가동

04 안전 관리

개물림과 인파, 감염병 동시 대응, 평시부터 위험까지 단계별 매뉴얼과 안전 전문인력 배치

05 홍보 수익

온오프라인 홍보 마케팅과 굿품 확산, 후원과 협찬 유치로 행사 가치를 더하는 수익사업 운영

06 사후 보고

기록사진 촬영과 정산, 결과보고서 작성, 산출물 제출까지 사업 마무리 일체

총 사업비 180,000,000원 범위에서 6개 영역을 단일 운영 체계로 통합 수행

현장을 아는 운영으로 안전과 감동을 동시에 잡는 접근

검증된 운영 노하우의 화명생태공원 현장 이식, 안전 최우선 설계, 공익 연계의 세 결

01

현장 이식

반복 운영에서 겪고 막아본 노하우를 화명생태공원 잔디광장 지형에 그대로 옮겨오는 운영

강변 잔디 17,000m² 사전 탐사

동선과 시야, 음향 사전 시뮬레이션

지반 침하와 우천 배수 현장 점검

반려동물 동반 동선 분리 설계

탁상 기획이 아닌 발로 검증한 운영

02

안전 최우선

반려동물 동반 행사의 개물림과 인파 밀집을 선제 차단하는 단계별 안전 설계로 실현가능성 확보

평시 주의 경계 위험 4단계 매뉴얼

안전 면허 보유 전담 인력 배치

입퇴장 분산과 상시 안내 방송

감염병 대비 위생 동선과 응급 체계

안전이 곧 감동의 전제라는 운영 철학

03

공익 연계

동물보호의 날 취지를 프로그램에 녹여 축제 2일을 친화도시 정책 가치로 잇는 설계

유기동물 입양과 책임 입양 캠페인

반려인 비반려인 공감의 장 구성

시 정책 부서 유관기관 협력 운영

생태공원 가치를 세대가 함께 발견

행사가 끝나도 남는 정책 메시지

세 결이 모여 화명생태공원 잔디광장에서 안전과 감동, 공익을 한 무대에 세우는 추진 전략

CONCEPT SLOGAN

함께 걷는 도시, 함께 사는 가족

반려인과 비반려인이 한 광장에서 만나, 사람과 동물이 함께 머무는 도시를 선언

축제 2일의 교감이 일상의 친화도시로 이어지는 메시지

교감

책임

일상

확산

**반려동물과 마음
을 잇다**

**끝까지 함께하는
약속**

**강변에서 누리는
쉼**

**축제가 친화도시
로**

체험과 교육 프로그램

유기동물 입양과 등록

가족 힐링과 여가

2일이 365일로 이어짐

축제 정체성을 한 장면으로 응축한 키비주얼

메인 포스터 시안과 컬러, 캐릭터 톤앤매너를 한 자리에 담아내는 비주얼 기준

[메인 포스터 키비주얼 시안 자리]

디자이너 작업 영역

컬러 톤앤매너

함께 걷는 도시의 따뜻한 결과 강변 자연의 맑은
결을 흑백 6색 기준으로 정리. 캐릭터와 사인, 굿
즈로 옮겨도 흔들리지 않는 색 위계 확립.

캐릭터 톤

반려동물과 시민이 나란히 걷는 한 장면을 캐릭터
로 응축. 교감과 책임, 일상의 결을 표정과 자세로
담아 포스터에서 현장까지 통일.

메인 키비주얼을 기준으로 행사 전반의 톤을 통일해 축제 이미지 브랜딩 확립

현장 사인과 굿즈로 확장되는 비주얼 체계

메인 키비주얼을 기준으로 톤을 통일해, 안내사인부터 한정판 굿즈까지 하나의 정체성으로 잇는 응용 설계

안내사인 및 가이드맵 적용안

☞ 잔디광장 전체 가이드맵, 부스존 안내사인, 동선 화살표 사인 응용 시안

화명생태공원 잔디광장 약 17,000m² 전역에 키비주얼 톤을 적용한 가이드맵과 방향 사인 배치. 부스존, 무대, 체험존을 색 구분 없이 형태로 직관 안내.

기념품 굿즈 적용 시안

☞ 반려동물 동반 한정판 굿즈, 에코백, 반려견 인식표, 배변봉투 디스펜서 키비주얼 응용

키비주얼 활용 한정판 굿즈 제작. 반려가족이 일상에서 사용하는 인식표, 에코백, 배변봉투 디스펜서로 축제 메시지를 행사 이후로 확장.

축제 2일이 **친화도시 365일**로 이어지는 효과 설계

행사장 규모 약 17,000m², 동물보호의 날 10.4 연계

이들의 현장 경험을 일상의 친화도시 행동으로 남기는 세 갈래 효과

효과 1

친화도시 인지도 제고

주관매체 생중계와 숏폼 확산으로 부산 반려
도시 메시지 전국 노출

현장 사인과 굿즈 비주얼로 축제 정체성 반복
각인

측정 행사 전후 인지도 설문 비교

효과 2

입양과 등록 실질 성과

동물보호의 날 10.4 연계 입양 부스로 만남
에서 입양 결정까지 현장 안내

동물등록 현장 접수 창구 운영으로 절차 부담
해소

측정 현장 입양 상담 등록 접수 건수 집계

효과 3

지역 상생 참여 확산

지역 상인 먹거리 장터와 반려용품 참가기업
부스로 강변 상권 유입

반려인과 비반려인이 함께 머무는 동선으로
세대 참여 확산

측정 참여 부스 가동률 체험 참여 인원 집계

세 효과를 행사 종료 후 결과보고에 정량과 정성으로 함께 기록해 차기 축제에 이어지는 근거 마련

반복 운영 노하우를 **실행가능성**으로 증명하는 차별점

겪고 막아본 경험이 안전과 동선의 설득력으로 이어지는 운영

01

현장을 아는 운영 경험

본 행사 연속 운영 경험 보유 수행사

잔디광장 약 17,000m²의 부스존, 무대, 체험 구역 위치를 이미 검증한 현장 이해. 처음 그리는 도면이 아니라 운영해본 공간을 다시 다듬는 접근. 진입로 폭, 응급차 회차 동선, 우천 시 배수 지점까지 현장 데이터로 보유.

02

막아본 안전 노하우

개물림과 인파 사고를 사전에 차단

반려동물 동반 행사의 핵심 리스크인 개물림을 입장 시 목줄과 인식표 점검으로 선제 차단. 평시, 주의, 경계, 위험 4단계 대응 매뉴얼로 인파 밀집과 감염병을 동시에 관리. 사고를 막아본 경험이 매뉴얼의 신뢰가 되는 안전 체계.

03

검증된 동선 설득력

동선과 배치를 검증한 운영 설계

관람객 동선과 반려동물 동선을 분리해 혼잡을 막아온 운영 데이터. 시간대별 인파 흐름을 분단위로 통제할 타임라인 기반 배치. 도면이 아닌 실제 운영 기록으로 배치 근거를 제시하는 실행가능성.

세 가지 차별점은 화명생태공원 일원, 2026.10.3 ~ 10.4 행사를 실패 없이 운영하는 근거

행사 전 과정을 자체 역량으로 수행하는 **통합 운영 체계**

기획에서 조성, 운영, 안전, 사후까지 한 팀이 잇는 수행 구조

01 제안사 일반현황

[제안사 일반현황]

회사명
사업자번호
대표자
주소
설립연도
임직원수

디자이너, 사용자가 채울 자리

02 조직 및 인증

[조직 구성표]

PM
현장 디렉터
안전 관리
프로그램 운영
홍보 마케팅
보유 인증

디자이너, 사용자가 채울 자리

03 유사 사업 실적

[유사 사업 실적]

사업명
발주처
수행기간
사업비
역할

디자이너, 사용자가 채울 자리

기획부터 조성, 운영, 안전, 사후 보고까지 외주 분절 없이 자체 인력으로 잇는 단일 책임 수행 체계



추진계획

준비부터 사후까지 단계로 잇는 **총괄 추진 체계**

STEP 01

기획 준비 단계

착수보고와 실행계획 확정, 인허가 사전 협의

STEP 02

조성 사전 운영 단계

공간 도면 확정, 부스 모집과 출연진 계약

STEP 03

현장 실행 단계

10.3 ~ 10.4 운영, 안전 통제와 돌발 대응

STEP 04

사후 정산 단계


철거와 정산, 만족도 조사 후 결과보고

이미지 영역

교감과 경쟁, 힐링을 한 동선에 엮는 프로그램 구성

행사장 약 17,000m² 잔디광장, 메인무대와 Dog스포츠, 수영장, 힐링캠프의 네 결

잔디광장 한 면에 네 공간을 펼쳐, 입장 동선이 교감에서 경쟁, 다시 힐링으로 자연스럽게 흐르도록 배치

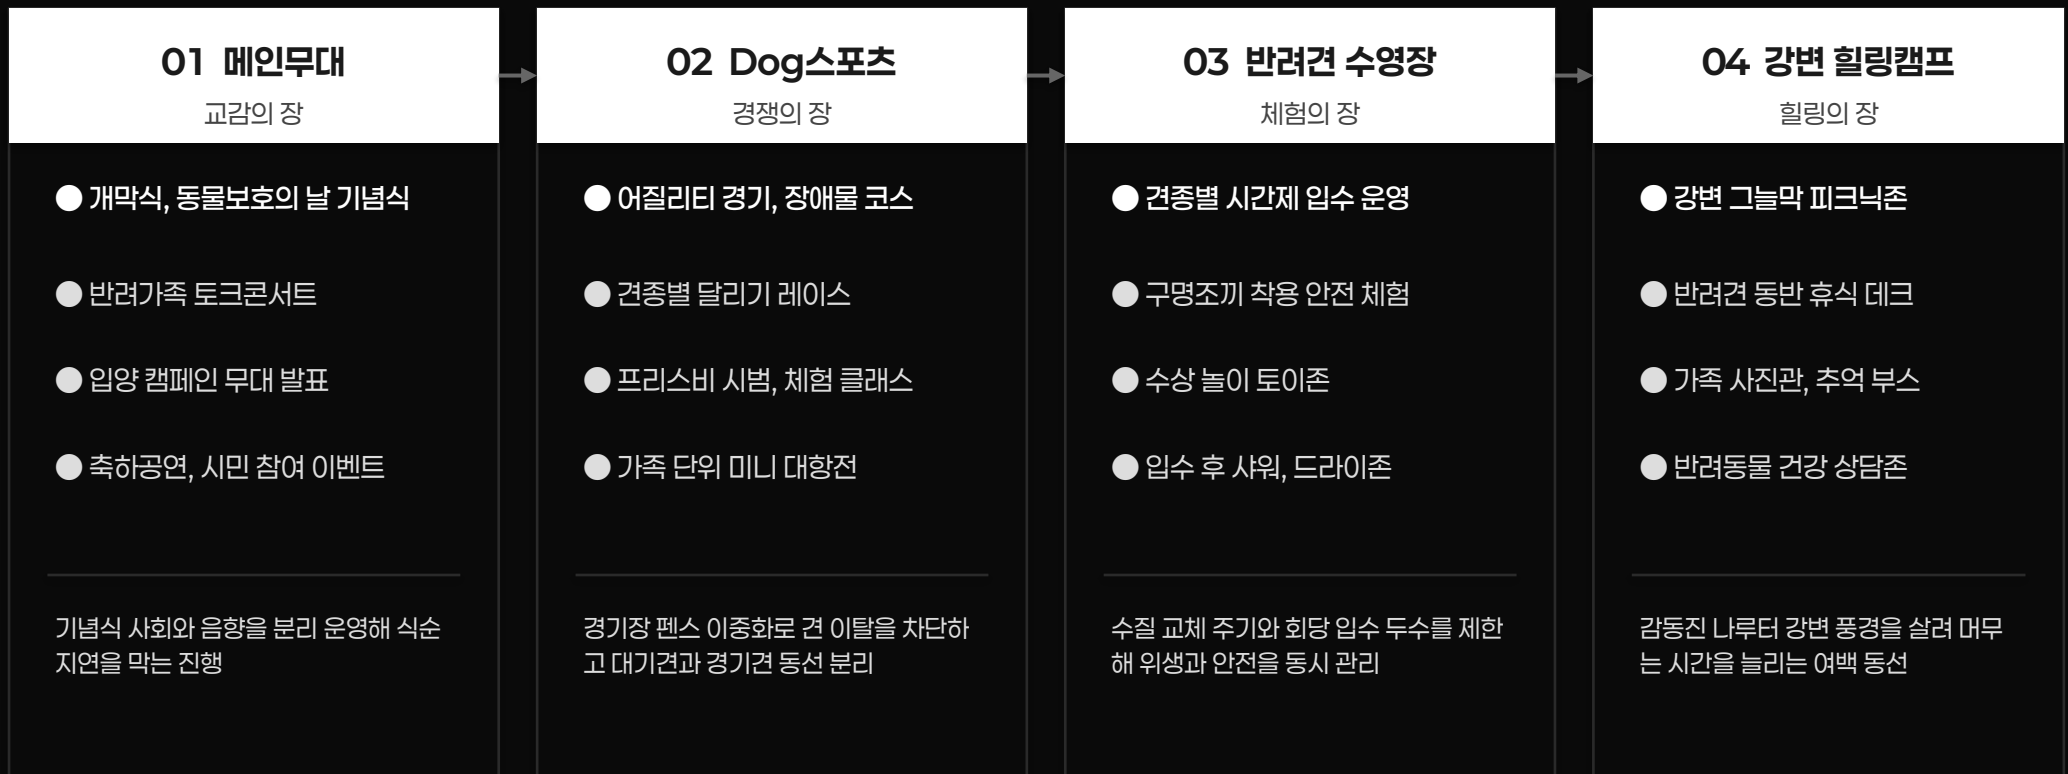

네 공간을 잔디광장 한 면에 엮어, 교감으로 모여 경쟁으로 즐기고 힐링으로 머무는 가족 여가 여정 설계

체험 동물복지 정책을 프로그램으로 구현하는 연계 설계

유기동물 입양, 동물등록, 무료 진료, 반려문화 교육을 한 동선에 잇는 정책 체험 흐름

정책 체험 4단계 동선 (방문 순서)



유기동물 입양 부스

보호소 연계 입양 대기 동물 현장 매칭. 입양 상담 데스크에서 가족 구성, 주거 형태 확인 후 책임 입양 서약. 입양 후 사후관리 연락처 등록까지 일괄 진행.

동물등록 연계 절차

내장형 마이크로칩 등록 안내 후 현장 접수 데스크에서 보호자 정보 입력. 부산시 동물보호 정책 부서 시스템과 연계해 미등록 반려견 현장 등록 유도.

무료 진료 연계

수의사회 협력 무료 기초 진료. 동물등록 완료 보호자 우선 안내로 등록 유인. 예방 접종 상담, 기생충 점검 동선 분리로 대기 혼잡 차단.

반려문화 교육 체험

에티켓 교육, 펫티켓 OX 퀴즈, 반려동물 응급처치 시연. 비반려인도 참여하는 생명 존중 교육 부스로 세대 공감 체험 마련.

반려인과 비반려인을 함께 끌어들이는 부대행사 흐름

반려인 참여

반려동물 패션쇼

가족 단위 무대 참여로 광장에 활기를 더하는 메인 부대행사

반려인 참여

반려동물 장기자랑

관객 호응 기반 무대 진행으로 보는 즐거움과 참여를 동시에 설계

비반려인 참여

참여형 체험 부스

동물복지 퀴즈와 만들기 체험으로 비반려인도 머무는 동선 구성

전 세대 참여

포토존과 SNS 인증

강변 풍경을 살린 포토존과 해시태그 인증으로 자발적 확산 유도

무대와 체험 권역

메인무대존과 동적 체험 구역을 강변 안쪽으로 집결

메인무대존 전면에 객석 배치, 음향 간섭 없는 시야 확보

Dog스포츠 경기장은 펜스 구획 후 관람 동선 외곽 분리

수영장 체험 구역은 급배수 동선 인접 배치로 운영 효율

약 17,000m² 잔디광장 중앙축에 동적 권역 집중

머무는 휴식 권역

강변 힐링캠프와 부스존을 외곽 동선으로 분산

강변 풍경 활용한 힐링캠프를 잔디 가장자리에 배치

부스존은 주출입구 인접 배치로 진입 즉시 체험 유도

몽골텐트 100동, 캐노피 20동을 권역별 분산 설치

관람 동선과 휴식 동선 교차 최소화로 혼잡 완화

무대 시야와 음향을 검증한 메인무대 조성 실행

구조물 규격과 설치 공정, 음향 조명 배치, 객석 시야와 안전 펜스를 한 흐름으로 검증

구조물 규격과 설치 공정

무대 본체

잔디광장 지반 특성상 팍, 앵커 설치 불가. 콘크리트 블록과 모래주머니, 자체 하중 설계로 고정.

지붕 트러스

강풍 대비 트러스 풍하중 검토 후 와이어 보강. 우천 시 배수 경사로 무대 바닥 미끄럼 차단.

설치 공정

행사 전일 야간 반입, 기초 고정, 무대 골조, 음향 조명 순으로 공정 분리해 동선 충돌 차단.

철수 공정

10.4.(일) 폐막 후 역순 철수. 생태공원 잔디 원상복구까지 공정에 포함.

시야, 음향, 안전 검증

음향 시스템 배치

메인 스피커는 객석 폭에 맞춰 좌우 분산. 후방 딜레이 보강으로 음 도달 편차 최소화.

조명 배치

주간 행사 대비 무대 정면 역광 차단 각도로 조명 설치. 야간 전환 시 객석 안전 동선 조명 확보.

객석 시야 확보

무대 높이를 객석 후열 시야 기준으로 산정. 음향 타워가 시야를 가리지 않게 측면 배치.

안전 펜스 설치

무대 전면 방호 펜스로 관람객 접근 차단. 반려동물 동반 특성상 펜스 하단까지 막아 이탈 방지.

검증 원칙. 설치 전 시야음향 사전 점검, 강풍 우천 시 고정 보강, 펜스로 무대 관람객 분리.

메인무대와 광장 전경을 입체로 구현한 연출컷

화명생태공원 잔디광장 약 17,000m², 메인무대 시야와 광장 동선을 한 장면으로 응축

[3D 공간조성 연출컷 자리]

메인무대 조감도, 광장 전경 입체 연출

잔디광장 약 17,000m², 감동진 나루터 앞 강변 풍경 반영

디자이너 작업 영역

Dog스포츠 경기장과 수영장 **체험 공간 연출**

반려견이 뛰고 헤엄치는 순간을 입체로 그려낸 체험 공간 설계

[Dog스포츠 경기장 조감도 자리]

디자이너 작업 영역

어질리티 트랙과 관람 데크로 경쟁과 응원을 한 시야에 담은 경기장 구성

화명생태공원 잔디광장 약 17,000m² 안에 강변 풍경을 살린 체험 공간으로 연출

[반려견 수영장 연출컷 자리]

디자이너 작업 영역

수심 단계를 나눈 풀과 미끄럼 방지 진입로로 안전한 물놀이 동선 연출

강변 힐링캠프와 부스존의 머무는 풍경

화명생태공원 일원 약 17,000m², 강변 풍경을 따라 머무는 공간으로의 연출 전환

[3D 공간조성 연출컷 자리]

강변 힐링캠프, 부스존 야간 조명 연출 조감도

디자이너 작업 영역

연출 포인트

강변 힐링캠프

투명 에어돔과 빈백을 강변에 배치, 강물과 노을을 등진 채 반려동물과 머무는 휴식 풍경

부스존 야간 조명


스트링 조명과 스팟 조명으로 동선을 따라 빛의 길 연출, 해 진 뒤에도 머무는 부스 풍경

머무는 동선 설계


라운드 휴게공간과 야외 식음 부스를 강변 선형으로 이어, 스쳐 지나가지 않고 머무는 여정 구성

강풍과 우천에 대비한 **부스시설 설치 시방**

몽골텐트 100동, 캐노피텐트 20동 / 의자 1,500개, 테이블 200개 내외



몽골텐트 100동, 캐노피텐트 20동



잔디 연약지반 우선 추가 고정



단계별 천막 철거 판단 구간



전 부스 사용 중지 발령

2일 시간대별 동선을 분 단위로 통제하는 운영 타임라인

행사 2026.10.3 ~ 10.4 (2일간), 개막식 기념식 포함

준비, 개막, 본행사, 철수를 한 흐름으로 잇는 4단계 공정



1일차 2026.10.3.(토) 개막식 기념식 흐름

시간대	운영 내용
오전	무대 음향 리허설, 부스 사전 점검
정오	VIP 대기실 운영, 입장 동선 개방
오후 초반	개식 선언, 개회사, 축사, 테이프 커팅
오후 중반	동물보호 캠페인 선포, 축하 공연
오후 후반	체험존 상시 운영, 1일차 정리 점검

2일차 2026.10.4.(일) 본행사 프로그램 흐름

시간대	운영 내용
오전	시설 재점검, 부스존 개방, 관람객 입장
정오	Dog스포츠 경기, 수영장 체험 운영
오후 초반	반려견 패션쇼, 강변 힐링캠프 체험
오후 중반	메인 무대 공연, 경품 추첨 이벤트
오후 후반	폐막 정리, 철수 착수, 원상복구 시작

철수 및 원상복구 공정

행사 종료 직후 무대 음향 해체, 부스 철거, 폐기물 분리 반출 순으로 진행. 잔디광장 17,000m² 원상복구는 2026.10.30.(금) 이전 완료. 철수 동선과 차량 진입로를 분리해 잔존 관람객 안전 확보.

26

관람객과 반려동물 동선을 분리해 혼잡을 막는 운영

입퇴장 게이트를 동서로 이원화해 진입과 회수 동선이 겹치지 않게 설계

반려동물 동반 구역과 비동반 구역을 펜스로 구분, 접촉 지점 최소화

정오 전후 정체 예상 구간에 안내 인력 집중 배치, 분산 유도

주 관람 동선

잔디광장 입구에서 메인무대까지 단일 흐름 유지

분산 동선

부스존 측면에 보조 통로 확보, 혼잡 구간 우회 유도

반려동물 분리

Dog스포츠존과 비동반 휴게 구역 펜스로 격리

관리 동선

안전 요원 전용 통로로 응급 시 신속 진입 확보

평시

주의

경계

위험

**사전 점검과 안전
교육**

**위험 징후 감시 강
화**

**통제선 가동, 동선
분리**

즉시 신고와 대피

전 인력 매뉴얼 숙지

순찰 주기 단축 운영


보안인력 전진 배치

119 연계, 운영본부 통제

반려동물 동반 행사의 **핵심 리스크를 선제 차단**하는 설계

입장 시 목줄 입마개 점검, 공격성 견 사전 분리, 사고 발생 시 응급 대응까지 단계로 잇는 매뉴얼

개물림 예방 4단계 절차

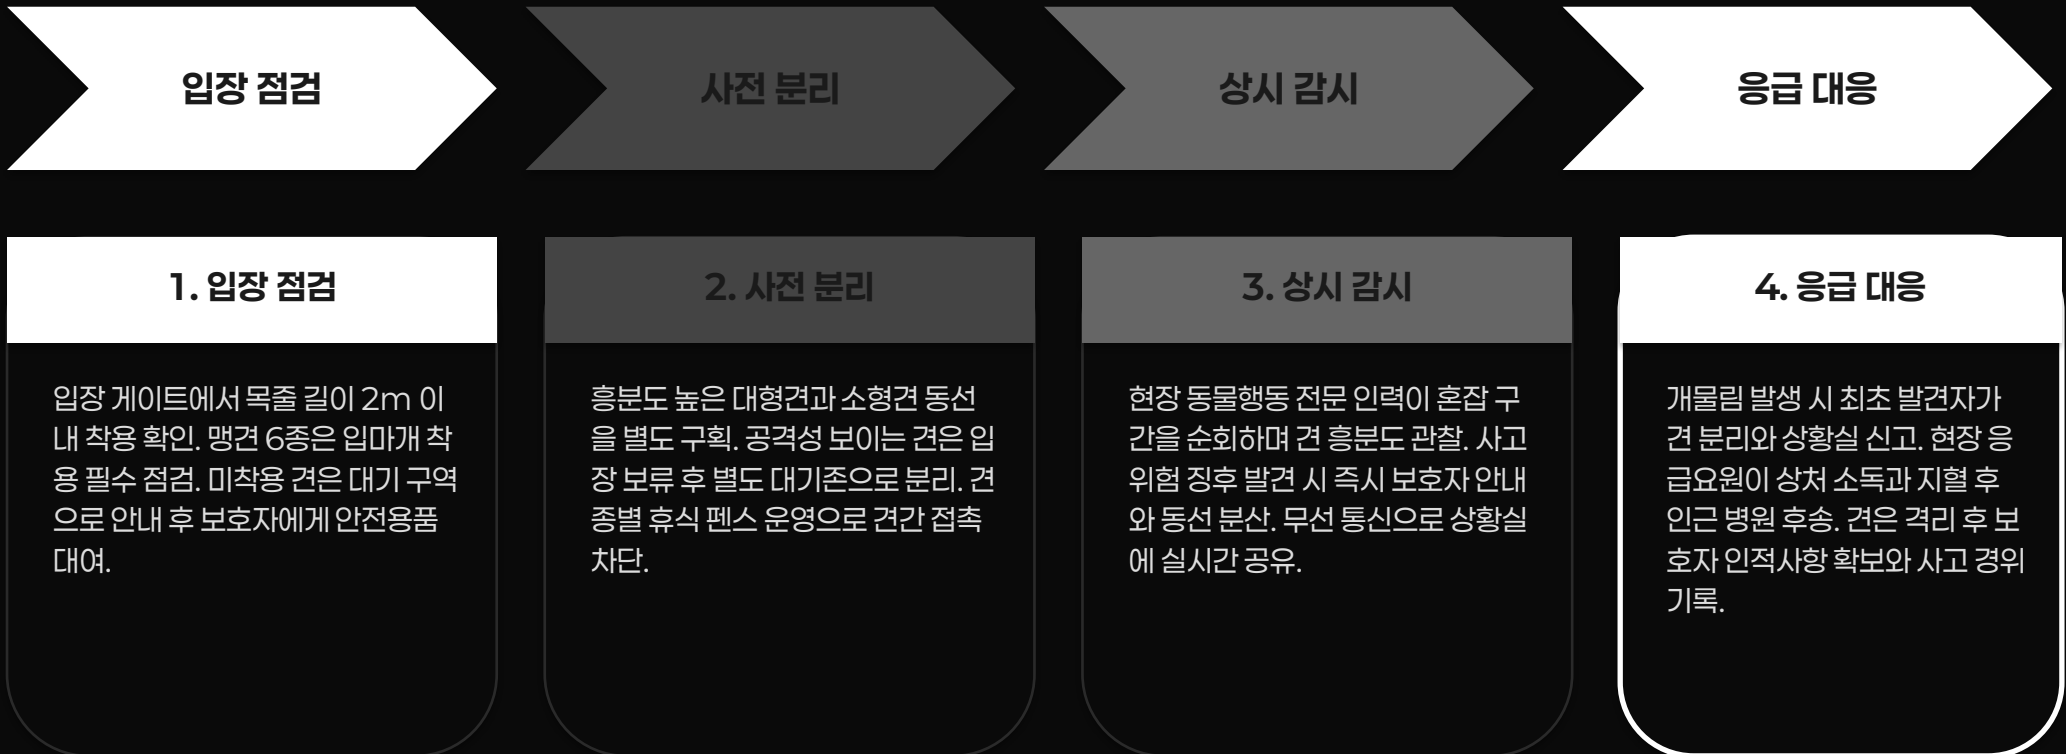

본 행사 운영 경험에서 겪고 막아온 견간 접촉 사고는 입장 분리와 상시 감시 이중 절차로 선제 차단

인파 밀집과 감염병 위험을 **사전에 분산**하는 관리 방안

밀집도 모니터링과 분산 유도, 동물 감염병 차단 방역, 보험과 비상 의료 대응을 한 체계로 운영

인파 밀집도 관리

잔디광장 17,000m² 구획 모니터링

메인무대 앞, 부스존, 수영장 체험 등 밀집 우려 구역을 권역으로 나눠 운영본부에서 실시간 인원 관측

분산 유도 운영

혼잡 임계 도달 시 안내방송과 동선 안내요원이 부대행사존으로 관람객 분산, 일방향 통행 유도

밀집 단계 보고 체계

사고 발생 직후 운영본부 즉시 보고, 1시간 이내 임시 보고

동물 감염병 차단 방역

입장 단계 건강 확인

반려동물 동반 입장 시 예방접종 확인과 발열, 이상 증상 육안 점검, 미접종 개체 입장 제한

구역별 방역 소독

행사 전 집중 소독 후 운영 시간대 살균과 살충 교차 시행, 화장실과 배변 처리 구역 우선 방역

보건소 협조 방역

전문 방역 용역업체와 관할 보건소 연계로 인수공통 감염 확산 사전 차단

보험과 비상 의료

행사 종합 보험 가입

행사 취소, 배상책임, 진행요원 상해, 시설 재물 손해를 포괄하는 행사 보험으로 사고 손실 보장

현장 응급 의료 체계

응급처치요원이 현장 1차 처치 후 상태 판단, 후송 필요 시 인근 병원 즉시 이송 동선 사전 확보

유관기관 지원 연계

소방서, 보건소, 인근 병원과 비상 후송 체계 사전 협의

사고 대응 흐름

즉시 보고

1시간 임시보고

상세 보고서

재발 방지 대책

단계와 타겟을 나눠 **인지에서 참여로** 잇는 홍보 전략

STEP 01

사전 인지 형성

보도자료와 옥외 매체로 행사 인지 확산

STEP 02

참여 욕구 자극

SNS 숏폼 콘텐츠로 참여 동기 부여

STEP 03

현장 집객 극대화

행사 2일 실시간 콘텐츠로 방문 유도

STEP 04

사후 인식 확산

기록 영상과 성과 공유로 친화도시 메시지 지속

이미지 영역

숏폼과 SNS로 자발적 확산을 만드는 채널 실행

SNS 숏폼 제작과 송출, 언론 보도와 홈페이지 운영, 현장 인증 이벤트로 잇는 2차 확산

ONLINE SNS·숏폼

관객이 퍼뜨리는 콘텐츠 설계

공식 인스타그램, 유튜브 쇼츠, 틱톡 채널 동시 개설. 반려동물 동반 일상을 담은 세로형 숏폼을 행사 전부터 주기 게시.

출연 셀럽 없이도 시민이 직접 찍어 올리도록 촬영 가이드와 해시태그를 통일.

카드뉴스로 프로그램 일정과 참여 방법을 안내하고, 행사 키워드 검색 시 공식 채널 상단 노출 유도.

카카오톡 채널 개설 후 신청자 대상 알림 발송으로 재방문 견인.

PRESS 언론·홈페이지

신뢰를 더하는 공식 채널

동물보호의 날 의미와 친화도시 정책을 묶은 보도 자료를 단계별로 배포. 행사 전 사전 고지, 행사 중 현장 스케치, 행사 후 성과 보도로 노출 구간을 나뉘.

행사 고지와 신청, 일정 안내, 기록 아카이빙을 담은 공식 홈페이지를 커뮤니케이션 허브로 운영.

지역 언론 인터뷰와 기획 기사로 화명생태공원 무대의 공익 메시지를 확산.

ONSITE 현장 인증

참여가 다시 확산을 부르는 고리

행사장 포토존과 인증 부스에서 반려동물과 함께 찍은 사진을 공식 해시태그로 올리면 굿즈를 증정하는 인증 이벤트 운영.

현장에서 만든 콘텐츠가 다시 SNS로 퍼지며 비참여 시민의 관심을 견인.

행사 종료 후 참여자에게 기록 영상과 감사 메시지를 발송해 친화도시 메시지의 잔상을 남김.

인지 형성에서 자발적 확산까지, 세 채널이 서로의 콘텐츠를 끌어올리는 선순환 구조

분야별 전문 인력을 행사 현장에 최적 배치하는 운영

유사 행사 경험을 가진 핵심 인력 중심으로 구성, 분야별 업무 분장과 시간대별 투입으로 안정 운영 확보

전담 TF 6부문 구성

총괄 PM	기획	연출	홍보	설치	사후
착수일부터 종료까지 사업 총괄 책임, 단독 의사결정	프로그램 구성, 운영 동선 설계, 규시트 관리	메인무대 진행, 음향 조명 통제, 무대 규 운영	디자인, SNS 운영, 현장 사인 굿즈 제작 관리	부스 무대 시설 설치, 강풍 우천 대비 시방 점검	철수 정산, 결과보고서 작성, 산출물 정리

현장 운영 인력 시간대별 투입

구분	주요 업무	투입 시점
슈퍼바이저	진행요원 인력 관리, 부문별 협조 조율	행사 1일 전부터
진행요원 (무대)	메인무대 프로그램 운영, 출연자 안내	행사 양일 전일 교육 포함
진행요원 (체험)	Dog스포츠 수영장 체험 부스존 운영 안내	행사 양일 시간대별 교대
안전요원	개물림 사고 예방, 인파 밀집 분산 통제	관람객 입장 시간 전 배치
응급 대기조	응급구조요원 2인 1조 상시 대기, 의무실 연계	행사 운영 전 시간

선발 단계부터 유사 행사 운영 경험자 위주로 모집, 행사 전일 현장 교육 후 보고체계 수립으로 안정적 현장 운영

후원과 협찬으로 행사 가치를 더하는 수익사업 설계

반려동물 산업 협찬 유치, 부스 입점 수익 연계, 대행사 인센티브 환원으로 잇는 구조

현재 수익 구조

예산 180,000,000원 단일 자원 의존

협찬 미연계


반려동물 산업과 접점 없는 운영

부스 단순 임대

입점 부스가 수익으로 환원되지 않음

재투자 부재

잉여 자원의 시민 환원 통로 없음



제안 수익사업 구조

자원 다변화로 행사 가치를 확장하는 설계

반려동물 산업 협찬 유치

사료, 용품, 펫보험사 대상 부스 협찬 제안


부스 입점 수익 연계

체험과 판매를 잇는 입점 부스로 수익 회수

대행사 인센티브 환원

잉여 협찬분의 행사 프로그램 재투자

협찬 자원은 화명생태공원 잔디광장 약 17,000m² 부스존 운영비와 시민 체험 프로그램으로 환원, 축제 2일의 가치를 시민 일상으로 잇는 선순환 구조 확립




사업관리

착수에서 결과보고까지 빈틈없는 일정 관리 체계

수행기간 착수일 ~ 2026.10.30 / 결과보고 초안 2026.10.20까지

5단계 공정으로 잇는 추진 마일스톤



공정	착수월	10월 1주	행사 D-day	10.30 종료
행사가획 및 구성	방향 설정, 콘셉트 확정			
프로그램 섭외 운영	출연 섭외, 부스 모집			
공간 조성 시공		무대, 부스 설치		
현장 운영			2일 운영	
정산 및 결과보고				초안 10.20, 종료 10.30

행사 전 공정은 주 1회 점검 회의로 진척을 관리하고, 지연 항목은 차주 보완 계획에 즉시 반영

행사 후 정산은 비용 증빙 마감, 결과보고 초안 2026.10.20, 최종 종료 2026.10.30 순으로 진행

예측 가능한 리스크를 단계로 관리하는 품질 체계

품질 점검과 검수 절차, 리스크 식별과 대응, 비상 상황 보고를 하나의 매뉴얼로 운영

품질 점검 및 검수 절차

단계	검수 기준
사전 검수	도면 대비 시설 설치 일치, 전기 부하 적정 확인
개막 전	음향 시야 동선 합동 점검, 비상 동선 확보 확인
운영 중	2시간 단위 순회 점검, 운영 본부 실시간 모니터링
철수 후	원상복구 확인, 화명생태공원 잔디광장 상태 기록


PM 1인 총괄, 분야별 담당이 점검표에 서명 기록

리스크 식별 및 단계별 대응

기상 악화	강풍 시 부스 결박 점검, 우천 시 차양 보강 후 단계 발령
개물림 사고	입질 건 격리 동선 확보, 응급 처치 후 119 연계
인파 밀집	구역별 입장 분산, 혼잡 구간 진입 일시 통제
전기 음향	예비 발전기 즉시 전환, 무대 음향 이중 회선 운영

리스크 등급 평시, 주의, 경계, 위험 4단계로 구분 발령

비상 상황 보고 체계



총괄책임자
119 직접 연계

산출물과 결과보고로 사업을 마무리하는 사후 관리

결과보고서 책자 2부 / 행사 기록물 및 영상 USB 1부

보고 체계

착수에서 완료까지 단계별 보고로 발주처와 명확한 커뮤니케이션 확립



착수보고회 진행, 주요 쟁점 수시 협의, 긴급 결정사항 발생 시 결정권자 즉시 보고

행사 2일간 운영 문제 발생 시 사안 보고와 대처방안 마련을 동시 수행하는 현장 보고 라인 구축

사후 발전 방향

행사 성과 분석과 개선 방향, 총평을 담아 차기 행사 활용 자료로 정리

관람객 대상 설문조사 결과와 인력 물자 운영 현황을 결과보고서에 포함

보고 라인 구축으로 기록과 정산, 발전 방향까지 빈틈없이 마무리

산출물 납품

행사 종료 후 결과자료 취합과 성과 분석을 담은 산출물 제출

결과보고서

행사장과 프로그램, 홍보, 부대행사 운영 결과를 정리한 책자 2부

정산보고서

용역비 집행 서류와 산출내역 최종 정리 후 회계 정산 보고서 작성

기록물 USB

전문 인력이 촬영한 현장 사진과 편집 영상을 USB 1부로 납품

문화체육관광부 평가기준 준수, 착수일부터 2026.10.30.(금) 사업기간 내 완료

검증된 이력의 전문 인력으로 실현가능성을 담보

유사 축제 5년 이상 경험자로 분야별 책임자를 구성, 자격과 종사경력을 증빙으로 입증

분야별 참여 전문인력 이력

역할	담당 업무	유사 경력
사업 총괄 PM	전 과정 의사결정	[경력 placeholder]
운영 디렉터	현장 동선 통제	[경력 placeholder]
안전 관리자	개물림 인파 대응	[자격 placeholder]
공간 연출	무대 부스 조성	[경력 placeholder]
홍보 담당	채널 운영 확산	[경력 placeholder]

각 분야 5년 이상 유사 축제 경험자로 구성, 업무 분장과 대체 인력 계획을 함께 수립

증빙 확인 체계

자격 및 종사경력

[자격증 사본, 경력증명서로 분야별 종사경력 입증 placeholder]

4대보험 정규직 확인

[자격취득 확인서로 정규직 고용 입증 placeholder]

대체 인력 계획

인력 부재 시 동일 등급 대체 투입, 사무국 일원화로 전담 관리

평가 단계 익명 처리, 개인 식별 정보는 디자이너 사용자가 채울 자리

사전 서류 심사와 면접으로 선발, 사전 교육과 현장 시뮬레이션으로 진행 안정성 확보

180백만원을 항목별로 투명하게 배분한 집행 계획

사업비 180,000,000원(부가세 포함)

예산 효율성 확보 방안

직접비 우선 배분 조성, 운영, 안전에 직접 닿는 항목에 예산을 집중. 관람객이 체감하는 영역 우선	협력사 인프라 활용 장치, 음향, 조명 협력 인프라를 단가 협상으로 묶어 시공비 절감	인하우스 제작 홍보 디자인, 영상, 굿즈를 자체 미디어팀이 제작해 외주비 최소화	안전비 고정 확보 행사 보험과 안전 인력 예산은 절감 대상에서 제외, 우선 고정 편성
---	---	--	---

항목별 집행 배분 (총괄)

구분	세부 내용	구성	비중
행사장 조성	메인무대, 부스시설, 공간 구획 설치 및 시공	직접비	32%
프로그램 운영	체험, 경기, 공연 진행 및 부대행사 운영비	직접비	24%
인력 운영	총괄 PM, 분야별 전담 인력, 현장 운영요원 인건비	직접비	16%
홍보 마케팅	온오프라인 광고, 숏폼 제작, 인쇄물 및 굿즈	직접비	12%
안전 관리	행사 보험, 안전 인력, 방역 및 비상 대응 물자	직접비	6%
일반 관리비	사업 수행 관리비 및 대행 수수료, 부가가치세 포함	간접비	10%

※ 비중은 총사업비 180,000,000원(부가세 포함) 기준. 세부 단가는 다음 장에서 명시.

항목별 단가와 산출 근거를 명시한 세부 집행 내역

총 사업비 180,000,000원, 모든 항목을 단가와 수량, 산출 근거로 풀어낸 집행 명세

행사장 조성비 산출내역

항목	단가	수량	단위	산출 근거
메인무대 시스템 렌탈	[단가]	1	식	무대 음향 조명 영상 일체
부스 텐트 설치 (반려동물 체험)	[단가]	[수량]	식	체험존 부스 풍압 보강 설치
공간 조성 사인 안내물	[단가]	1	식	17,000m² 동선 사인 일체

운영 인건비 산출내역

투입 인력	수량	역할 근거
총괄 PM 디렉터	1	현장 총괄
안전 통제 요원	[수량]	개물림 인파
구급 수의 대기 인력	[수량]	동물 응급

홍보 안전 항목 산출내역

항목	단위	산출 근거
SNS 숏폼 홍보	식	채널 확산 운영
인쇄 제작물 사인물	식	현장 사인 굿즈
안전 보험 방역 등록	식	행사 보험 가입

총 사업비 180,000,000원 한도 내 항목별 단가, 수량, 산출 근거 일체 명세

단가는 발주처 협의와 시중 시세 검증을 거쳐 확정하며, 항목별 세부 단가표와 산출 근거 명세는 계약 후 집행계획서로 제출, 디자이너 사용자가 채울 자리.

강변 머무름 공간 연출 컨셉 (잔디광장 야경 + 포토존)

강변 풍경을 살린 머무는 공간으로의 연출 전환

화명생태공원 약 17,000m²의 강변 입지를 살려 야간 조명과 포토존, 머무름 공간을 엮은 체류형 풍경을 연출

관람객 참여형 체험 설계

보는 자리에서 손을 보태는 자리 로

반려동물 핸들링 체험과 함께 만드는 굿즈 공방을 동선에 배치해
관람을 행동으로 전환

교감, 책임, 일상의 세 결을 직접 만지고 적어보는 참여 부스 운영

체험 완료 시 친화도시 메시지를 직접 남기는 시민 기록 벽 조성

시민 제안 반영, 반복 방문 유도

시민의 한마디가 다음 장면이 되 는 운영

현장 제안 게시와 사전 시민 의견을 콘텐츠 운영에 반영하는 양방
향 소통 채널

체험 동선 단계별 인증 적립으로 1일차 방문이 2일차 재방문으로
이어지는 리워드 구조

참여 기록을 사후 친화도시 캠페인으로 잇는 연속 설계

돌발 상황을 즉시 잡는 현장 통제 운영 역량

상황실

실시간 통제 거점

전 구역 상황 집중 관제

무전망

보고 라인 일원화

현장에서 본부로 즉시 전파

4단계

돌발 대응 매뉴얼

평시 주의 경계 위험

2분

초동 대응 목표

발생 인지부터 조치 착수

02

시 정책 부서와 유관기관을 잇는 협력 운영 체계

발주처 동물복지 정책 기조를 프로그램과 메시지에 그대로 반영하는 정책 부서 연계

수의사회, 동물보호단체, 구조 보호소를 현장 부스와 체험에 연결하는 유관기관 운영

운영본부 단일 채널로 협력사 물자 조달과 상황 보고를 통제하는 그물망 운영

정책 부서 협업

동물복지팀 기조를 프로그램 연계

유관기관 연계

수의사회, 보호단체 현장 배치

물자 조달 관리

협력사 수급, 설치, 회수 통제

단일 보고 채널

운영본부 one channel 상황 보고

겪고 막아본 경험이 **실현가능성**으로 증명되는 운영

본 행사 연속 운영 경험을 보유한 수행사의 현장 이해가, 강풍과 사고 대처 노하우로 이어지는 운영 신뢰

경험이 운영을 다르게 만드는 세 지점

01 현장을 아는 이해

본 행사를 연속으로 운영해 온 수행사가 화명생태공원 잔디광장 17,000m²의 지반과 강변 바람 길을 몸으로 안다는 사실.

도면으로는 보이지 않는 침수 우려 구간, 차량 진입로 폭, 관람객이 몰리는 길목을 사전에 짚어 배치 결정.

02 막아본 대처 노하우

강풍에 천막이 흔들린 순간, 개물림 위험이 번질 뻔한 순간을 현장에서 겪고 막아본 인력이 동일하게 투입.

풍속 단계별 부스 결박 순서, 사고 발생 시 격리와 신고 동선을 매뉴얼이 아니라 손에 익은 절차로 실행.

03 반복이 쌓은 동선

반복 운영에서 관람객과 반려동물이 어디서 영켰는지 데이터로 남았고, 그 기록이 올해 동선 배치의 출발점.

입퇴장과 무대 앞 정체 지점을 미리 알기에, 분리 동선과 안내 인력 배치를 검증된 위치에 우선 적용

겪지 않은 운영은 계획에 머물지만, 겪고 막아본 운영은 2026.10.3.~10.4. 이들의 실현가능성으로 증명

축제 이후에도 이어지는 **친화도시 메시지**의 확산


행사 후 콘텐츠 아카이빙 운영, 시민 자발적 공유 확산, 차년도 연계 홍보 기반 마련

단발 행사

2일의 현장, 끝나면 흩어지는 기억

- 현장 사진과 영상이 운영사 내부에만 남고 흩어짐
- 시민의 참여 기록이 공유되지 못해 여운이 단절
- 차년도 행사가 처음부터 다시 인지를 쌓아 올림
- 친화도시 메시지가 축제 종료와 함께 휘발

축제가 그 주말의 이벤트로 끝나는 구조



이어지는 확산

2일이 365일 친화도시 메시지로 연결

- 현장 사진, 영상, 시민 후기를 행사 후 통합 아카이빙
- 참여 인증샷 공유 이벤트로 시민 자발적 확산 유도
- 결과 보도자료와 후속 게시물로 차년도 기대감 제고
- 축적된 시민 DB가 차년도 홍보 기반으로 연계

축제가 일상의 친화 행동으로 번지는 구조

행사 종료 후 결과 아카이빙, 시민 공유 확산, 차년도 연계까지 잇는 사후 확산 설계

안전과 감동, 공익을 동시에 잡는 **통합 제안의 가치**

실행 디테일로 증명하는 실현가능성, 현장을 아는 운영의 신뢰, 정책 가치 구현의 공익성

기획부터 사후까지 단절 없이 잇는 통합 수행이 만드는 세 가지 가치

실현가능성

실행 디테일로 증명하는 가치

강풍과 우천에 대비한 부스 시방, 분 단위 운영 타임라인까지 도면과 절차로 명시한 실행 계획

17,000m² 잔디광장을 기능별로 구획한 배치, 메인 무대 시야와 음향을 사전 검증한 조성 실행

착수에서 결과보고까지 빈틈없는 일정으로 약속을 그대로 실행하는 운영 체계

운영의 신뢰

현장을 아는 가치

반려동물 동반 행사의 핵심 리스크인 개물림을 선제 차단하는 동선 분리와 안전 면허 인력 배치

관람객과 반려동물 동선을 분리해 혼잡을 막고, 돌발 상황을 즉시 잡는 현장 통제 운영

겪고 막아본 경험이 사전 시뮬레이션과 단계별 매뉴얼로 이어지는 운영의 신뢰

공익성

정책 가치를 구현하는 가치

동물보호에서 복지로의 대전환이라는 정책 메시지를 체험 프로그램으로 구현하는 연계 설계

반려인과 비반려인을 함께 끌어들이며 친화도시 공감대를 넓히는 부대행사 흐름

축제 2일이 화명생태공원의 친화도시 365일로 이어지는 공익 효과 설계

세 가치를 따로가 아닌 하나의 동선으로 잇는 통합 수행이 평가 종합 항목 전반에 답하는 제안

법령과 청렴을 기반으로 신뢰받는 수행 약속

착수일부터 2026.10.30.(금) 종료까지, 청렴과 보안, 법적 준수를 모든 단계에 새기는 운영

청렴 이행	보안 및 개인정보	법적 준수
행동강령 서약과 신고 체계 전 투입 인력 청렴 서약서 제출, 발주처 행동강령 준수 금품 향응 수수와 부정청탁 일체 차단, 위반 시 즉시 보고 협력사 발주와 정산 내역 투명 공개, 이해충돌 사전 점검 [청렴 이행 placeholder]	참여자 정보 보호 체계 현장 접수와 사전 신청 정보 수집 목적 외 사용 금지, 행사 종료 후 파기 반려동물 등록 정보와 촬영 영상물 접근 권한 최소화, 암호화 보관 개인정보 보호법 준수, 위탁 처리 시 수탁사 보안 점검 의무화 [보안 및 개인정보 보호 placeholder]	관련 법령 전수 준수 동물보호법과 공연법, 식품위생법 등 행사 관련 인허가 사전 취득 근로기준법과 산업안전보건법 준수, 현장 인력 4대 보험 가입 저작권법 준수로 음원과 영상 사용 정식 라이선스 확보, 분쟁 차단 [법적 준수 placeholder]

총 사업비 180,000,000원 집행 전 과정의 투명성 확보로 발주처가 믿고 맡기는 수행 약속

화명생태공원을 반려도시 부산의 무대로 만드는 약속

끝까지 책임지는 수행

행사 2026.10.3 ~ 10.4 / 행사장 화명생태공원 약 17,000m²

안전을 가장 먼저 두는 운영

반려동물 동반 행사의 핵심 리스크인 개물림과 인파 밀집을 사전에 차단합니다. 안전 면허 보유 인력을 현장에 배치하고, 사전 시뮬레이션으로 잔디광장 약 17,000m²의 동선을 검증합니다. 평시에서 위험까지 단계별 조치를 매뉴얼로 정리해 돌발 상황을 즉시 통제합니다.

시민 감동으로 남는 2일

보는 축제를 넘어 반려인과 비반려인이 함께 만드는 축제로 운영합니다. 교감과 책임, 일상의 결을 한 동선에 엮어 머무는 경험을 설계합니다. 2026.10.3과 10.4 이틀의 감동이 친화도시 부산의 365일로 이어지도록 동물복지 정책 가치를 현장에 새깁니다.

감사합니다

함께 걷는 도시, 함께 사는 가족

축제 2일의 울림이 천화도시 365일의 일상으로 이어지는 여정

화명생태공원 잔디광장에서, 반려도시 부산의 무대를 함께 만들겠습니다
