

2026 위드펫스타

동물보호의 날 축제

행사 대행 용역

강물처럼, 함께 흐르는 하루

반려와 사람이 강변에서 만나, 보호를 넘어 복지로



행사 일자 2026.10.3.(토) ~ 10.4.(일) (2일간)

행사 장소 화명생태공원 일원 잔디광장, 약 17,000m²

[제안사 영역]

CONTENTS

강변에서 체감하는 동물복지 대전환

화명생태공원 일원, 2026.10.3. ~ 10.4.

강물처럼, 함께 흐르는 하루를 잇는 다섯 흐름

I

제안개요

제안목적, 추진전략, 기대효과, 특징과 장점

II

기획구성

컨셉 슬로건, 프로그램, 개막식, 강변 체험

III

사업수행계획

총괄계획, 세부실행, 안전관리, 인력 운영

IV

행사운영역량 · 홍보 · 사업비

운영역량, 홍보마케팅, 수익사업, 사업비

V

사업관리 부문

추진일정, 품질·보고, 청렴·보안, 사후환류

총 50면 구성

기획에서 안전까지 단독수행으로 잇는 일관 운영



제안개요

보호를 넘어 **복지로**, 강변에서 체감하는 정책 전환

행사일 2026.10.3 ~ 10.4 (2일) / 화명생태공원 약 17,000m²

AS-IS 지금까지의 동물보호

선언 중심의 기념식

행사가 끝나면 사라지는 일회성 메시지

반려인 중심의 행사

비반려 시민과의 거리가 좁혀지지 않음

공간이 배경에 머무름

장소가 메시지로 이어지지 않는 구조

전환

TO-BE 강변에서 체감하는 복지

동물복지 현장 선포

동물보호의 날을 알리는 정책 메시지 1순위

반려와 비반려의 화합

세대와 입장이 함께 어울리는 화합의 장

강변 수변 공간을 자산으로

물가에서 체감하는 복지로 장소를 해석

화명생태공원 강변이라는 단 하나의 자산 위에서, 보호의 선언을 일상 복지의 체감으로 잇는 하루

기획에서 안전까지 **단독수행으로** 잇는 일관 운영 체계

사업비 180,000,000원 이내 / 착수일 ~ 2026.10.30 정산 완료

과업 범위, 네 영역의 공간을 강 따라 조성

메인무대

강변을 배경에 둔 개막식, 헌장 선포,
공연 진행 거점

Dog스포츠 경기장

활력 넘치는 반려 활동, 힐링 안의 한
장면으로 운영

반려견 수영장

물과 닿는 교감 체험, 수변 안전 동선
우선 설계

강변 힐링캠프

속도를 늦추는 쉼터, 체류형 감성 교
감 공간 조성

추진 전략, 착수에서 정산까지 한 흐름으로

기본계획 수립

기본계획, 세부 실행계획 수립

세부 실행설계

공간별 운영 시나리오 확정

현장 직접운영

단독이행 원칙, 외주 없이 직접 수행

결과보고 정산

정산 완료까지 전 과정 책임

단독이행 원칙에 맞춰 기획부터 안전까지 직접 수행, 책임 주체를 하나로 두어 현장 의사결정 지연을 차단

강변의 쉼이 시민 일상으로 스며드는 복지 도시 확산

정책

동물복지 정책 메시지 확산

동물복지 현장 선포로 선도 도시 부산 각인

화합

강변 산책 시민의 자연 유입

반려인과 비반려인이 함께 만드는 하루

전환

보호에서 복지로의 인식 전환

쉼의 경험으로 성숙한 반려 문화 정착

강변이라는 단 하나의 자산으로 만드는 변별의 차이

물을 주제로 묶고, 강을 따라 흐르는 여정으로 이야기를 잇는 경험

타 행사가 흩어진 프로그램을 나열할 때, 본 제안은 강이라는 자산 하나로 행사 전체를 하나의 결로 묶음

특징 1 물이라는 주제로 통합

산만하게 펼쳐지기 쉬운 프로그램을 물이라는 단일 주제로 한 덩어리로 통합

수영장, 힐링캠프, 체험 부스를 물길로 연결

관람객이 한 행사를 본 듯한 통일된 기억을 남기는 경험 구조

특징 2 강을 따라 흐르는 여정

강물의 흐름을 그대로 동선으로 옮겨 입장에서 퇴장까지 이야기가 이어지는 여정 설계

관람객이 강을 거슬러 건듯 자연스럽게 이동

동선이 곧 이야기가 되어 강변 17,000m² 공간을 끊임 없이 경험

특징 3 함께 머무는 화합 구조

비반려인이 망설임 없이 들어서는 진입로를 공간으로 설계해 모두가 머무는 화합 구조 마련

강변 쉼터를 누구나 머무는 열린 공간으로 구성

반려인과 비반려인이 강변에서 자연스레 어우러지는 도시 화합 경험

전 과정을 단독으로 책임지는 행사 전문 수행 역량

기획에서 안전, 홍보, 정산까지 하청 없이 한 조직이 이어가는 수행 체계

01 제안사 일반현황

[제안사 일반현황]

회사명, 대표자, 설립연도
주소, 사업분야, 종사기간
면허 등록증 보유현황

사용자가 채울 자리

02 유사 행사 운영 실적

[유사 행사 운영 실적]

사업명, 발주처, 수행기간
사업비, 수행 역할
축제 행사 운영 레퍼런스

사용자가 채울 자리


03 보유 전문인력 자격

[보유 전문인력 자격]

PM, 안전관리, 무대 연출
디자인, 영상, 홍보 인력
관련 자격 인증 현황

사용자가 채울 자리

기획 디자인 영상 안전 홍보 인력을 한 조직 안에 두어, 외주 분절 없이 행사 종료까지 책임이 끊기지 않는 단독수행 구조



기획구성

Concept Slogan

화명생태공원 강변

강물처럼, 함께 흐르는 하루

반려와 사람이 강변에서 만나, 보호를 넘어 복지로

물가에서 속도를 늦추고 서로를 마주하는 강변의 하루, 보호의 의무를 넘어 일상의 복지로 흐르는 정책 메시지를 한 세트로 전합니다.

물가에서 속도를 늦추고 교감하는 강변 힐링의 하루

FLOW 01

입구 기념식, 강변으로 들어서는 시작

동물복지 현장 선포로 하루의 걸을 여는 진입 연출

FLOW 02

물을 주제로 묶은 교감 체험

Dog스포츠, 수영장, 보트를 물 하나로 통합한 동선

FLOW 03

속도를 늦추는 수변의 활력

운동회의 생기를 강변의 잔잔함 안에 담은 장면

FLOW 04

힐링캠프로 잔잔하게 닫는 마무리

침의 경험으로 복지 대전환을 몸으로 느끼는 여정

이미지 영역

강과 반려, 사람을 잇는 키비주얼

강물처럼, 함께 흐르는 하루의 감성을 메인 비주얼 한 장에 담아낸 시안

[2D 키비주얼 메인 포스터 시안 자리]

강변, 물결, 반려동물 모티프 컬러 키비주얼

디자이너 작업 영역

비주얼 콘셉트 방향

강물 흐름 모티프

유려한 곡선으로 사람과 반려를 잇는 동선 형상화

물빛 컬러 톤

강변 풍경의 청량한 색감으로 힐링 감성 전달

반려 교감 일러스트

사람과 반려동물이 함께 머무는 순간을 담는 표현

메인 비주얼을 기준으로 행사 전반의 톤을 통일

포스터에서 굿즈까지 일관된 비주얼 적용

메인 키비주얼 기준으로 온오프라인 전 매체의 톤을 통일, 강변 축제 이미지의 일관 각인

한정판 굿즈

[리플릿 · 현수막 · SNS 카드 응용 시안 자리]

디자이너 작업 영역

포스터 · 리플릿

현수막 · 배너

SNS 카드뉴스

사인물 · 안내물

등록 데스크, 가로등 배너, 무대 배경, LED, 안내 X배너까지 메인 키비주얼을 확장 적용해 브랜드 아이덴티티를 통일. 모바일 리플릿과 SNS 카드는 동일 색조와 모티프로 제작, 온라인 예고에서 현장 안내까지 끊임 없는 비주얼 경험으로 잇는 적용 가이드.

물에서 만나는 하루로 묶은 프로그램 라인업

기념식에서 힐링캠프로 흐르는 동선, 강변 한 덩어리 구성

감동진 나루터 앞 잔디광장 약 17,000m²를 강변 한 덩어리로 묶어, 개막 기념식에서 출발해 활력의 Dog스포츠를 지나 물과 닿는 힐링캠프로 발걸음이 자연스럽게 흐르는 세 군의 프로그램으로 구성

PROGRAM 01

기념 프로그램

강변의 하루를 여는 선언의 시간

- 개막식, 강물처럼 흐르는 개막 연출
- 동물복지 현장 낭독, 보호에서 복지로의 약속 선포
- 내빈 인사, 주관기관 환영의 말
- 축하 공연, 강변 무대 첫 올림

위치, 메인무대 강변존. 모든 발걸음이 한 자리에 모여 하루의 의미를 함께 새기는 출발점

PROGRAM 02

협력 프로그램

함께 뛰며 교감하는 한낮의 장면

- Dog스포츠 운동회, 반려견과 함께 달리는 경기
- 어질리티 체험, 장애물 코스 도전 마당
- 견종별 참여 분리 운영, 안전 거리 확보
- 참여 시상, 완주의 기억 남기기

위치, Dog스포츠 경기장. 활력은 힐링 안의 한 장면, 뛰는 즐거움과 안전을 함께 잡는 운동의 시간

PROGRAM 03

수변 체험 프로그램

물과 닿으며 속도를 늦추는 시간


- 반려견 수영장, 물놀이 교감 체험
- 강변 보트 체험, 잔잔한 물길 따라 쉼
- 강변 힐링캠프, 그늘에서 함께 쉬는 자리
- 구명 장비 상시 비치, 수변 안전요원 배치

위치, 반려견 수영장과 강변 힐링캠프. 물과 닿는 모든 공간을 잇는 마무리, 하루의 쉼이 일상으로 스며드는 자리

동물복지 현장 선포를 중심에 둔 개막 연출

시장 참석 기념식 의전 동선, 현장 낭독 핵심 연출

개막식 시나리오 흐름, 화명생태공원 잔디광장 약 17,000m² 무대 기준

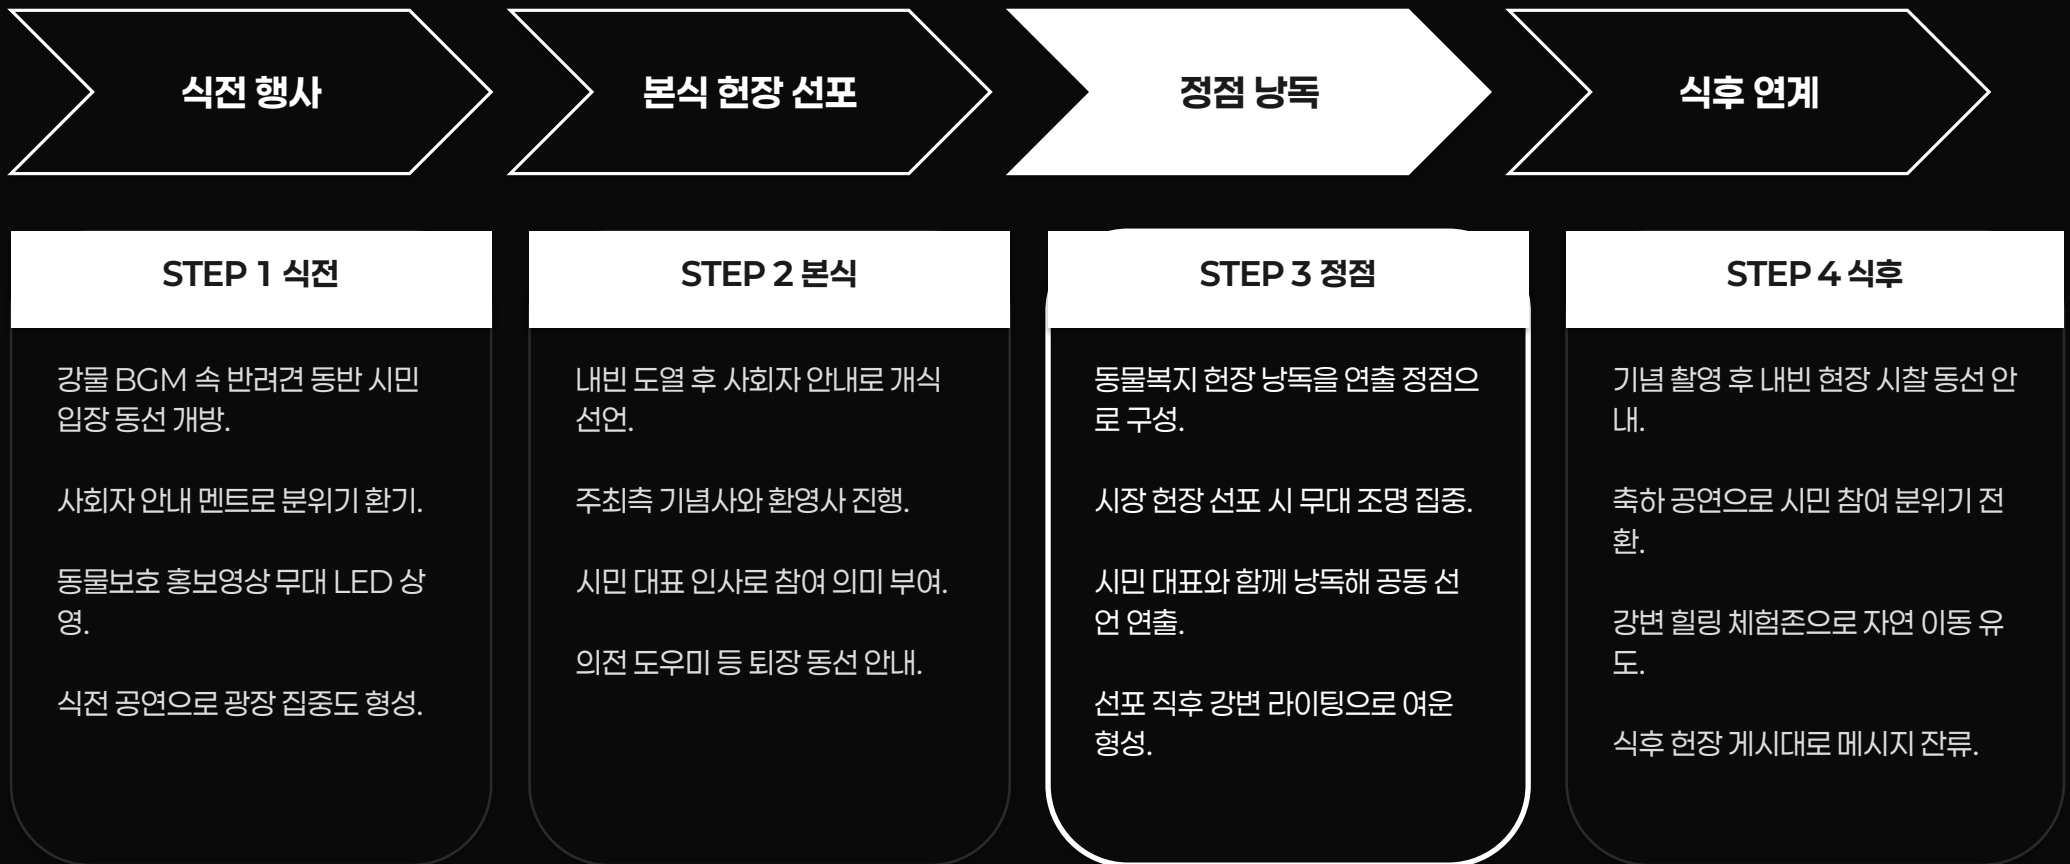

내빈 의전 동선과 시민 참여 동선을 분리 운영해 현장 선포의 격식과 강변 축제의 개방감을 동시 확보

속도를 늦추는 강변에서의 교감 체험

Calm 01

강변 힐링캠프 명상존

잔디광장 강변 라인에 매트 60면 배치, 회당 20분 가이드 명상
운영

Bond 03

반려견 수영장 수변 교감

수심 50cm 안전풀 조성, 입수 전 발 세척대와 라이프자켓 비치
로 동반 입수

Open 05

비반려인 개방형 체험

반려동물 없이도 명상과 산책 참여 가능, 보호 현장 메시지 카드
작성존 연계

Calm 02

감동진 나루터 산책로

강을 따라 1km 저속 산책 코스 조성, 발밑 자연음 사운드 가이드
동행

Bond 04


강변 보트 동반 체험

무동력 패들보트로 반려견과 함께 승선, 안전요원 1대1 동행 후
30분 운항

Open 06

강변 심 라운지

그늘막과 빈백 100석 배치, 보리차와 펫 음수대 함께 비치한 무
료 휴식 공간



사업수행계획

착수에서 정산까지 한 흐름으로 잇는 총괄 추진 체계

STEP 01

준비기, 기본계획 수립

착수보고와 운영매뉴얼 제작으로 토대 확립

STEP 02

준비기, 세부 구체화

공간 도면과 프로그램 연출안 단계별 검수

STEP 03

운영기, 행사 실행

2일간 현장 운영과 안전 점검 동시 가동

STEP 04

마무리기, 결과보고와 정산

2026.10.30 정산까지 산출물 일괄 마감

이미지 영역

강을 따라 흐르는 동선으로 설계한 운영 시나리오

입구에서 강변까지 단일 여정 / 비반려인 진입로 설계

화명생태공원 잔디광장 약 17,000m², 강변 단일 여정

관람객 메인 여정

- 1** **입구 기념존**
감동진 나루터 앞 진입부 포토존과 안내데스크 배치, 입장 동시에 현장 메시징 인지
- 2** **참여 부스존**
집객 물림 예상 부스 좌우 분산 배치, 안내요원 정체 구간 상시 배치로 우왕 좌왕 차단
- 3** **메인무대 체류존**
강변을 배경에 둔 무대 정면 관람 공간, 휴게 의자와 그늘막으로 장시간 체류 유도
- 4** **강변 힐링존**
물가에서 속도를 늦추는 교감 공간, 여정의 마지막을 강변의 쉼으로 마무리

흐름

동선 운영 3원칙

안전성

강변 가장자리 안전 펜스와 바리케이드 설치, 집객 물림 구간 안전요원 우선 배치로 물리적 안전 확보

편의성

부스 타입별 색상 구분으로 손쉬운 유입 유도, 휴게 의자와 그늘막으로 장시간 현장 체류 환경 조성


효율성

강변 산책 시민 위한 비반려인 별도 진입로 설계, 적재적소 인력 배치로 돌발 상황 즉시 대응 체계 운영

강변을 배경으로 둔 메인무대 운영 시스템

식전, 본식, 공연 운영 / 무대 안전 인력 배치

메인무대 진행 큐시트

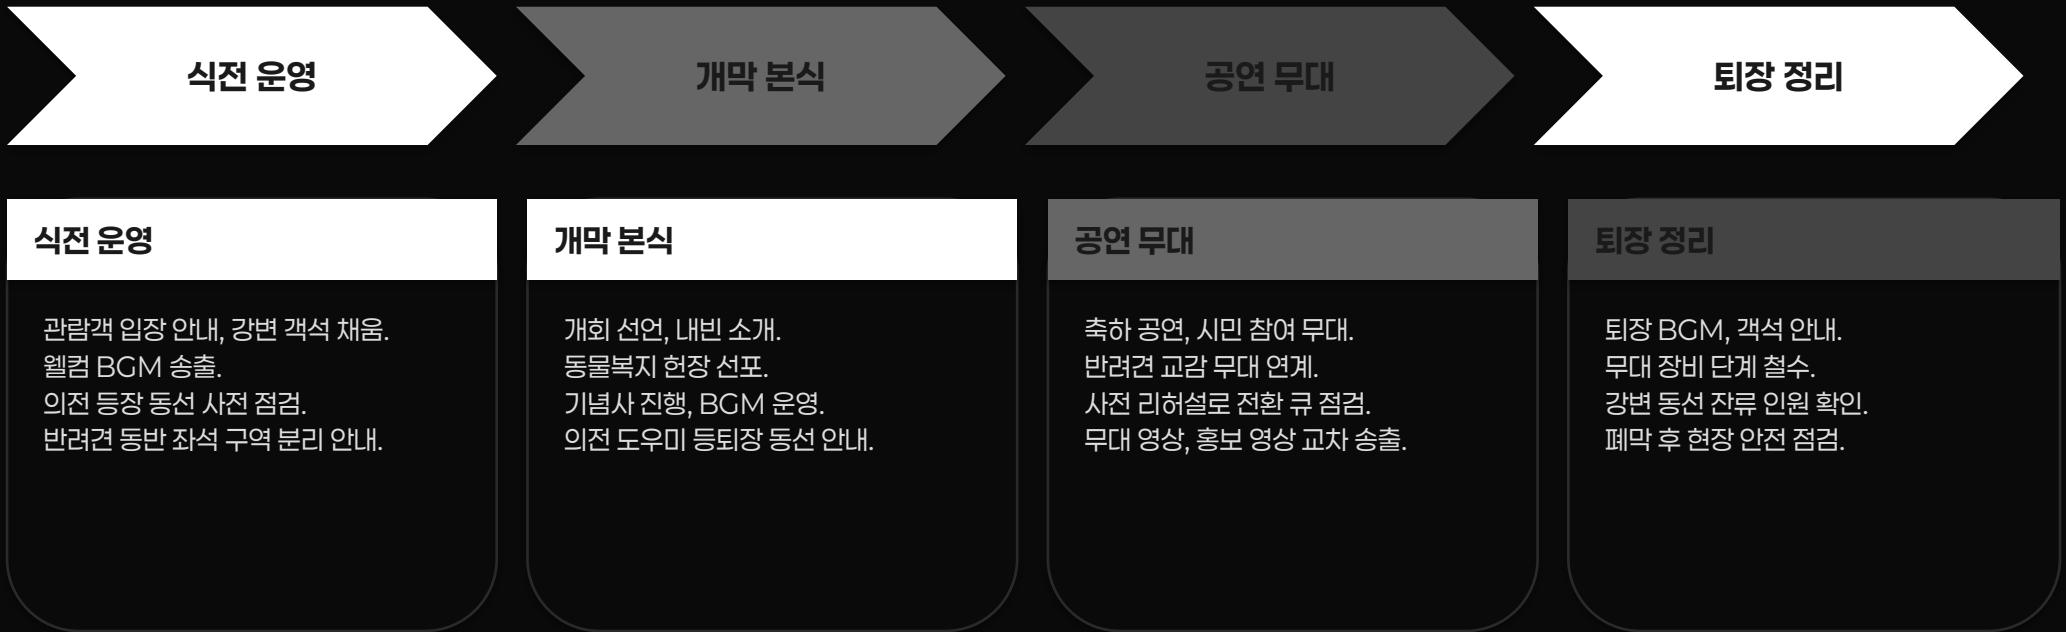

셋업 단계 운영

강변 지반 수평 점검 후 무대 베이스 설치. 음향 사운드체크, 조명 포커싱, 영상 LED 정렬을 순차 진행. 행사 전일 통합 리허설로 전환 규 확정.

강변 무대 안전 동선

무대 후면 강변 추락 방지 펜스 설치. 음향 2인, 조명 1인 상주. 무대 진행 안전요원, 객석 안전관리 인력 분리 배치로 진행과 통제 동시 확보.

활력은 힐링 안의 한 장면, Dog스포츠 운영

운동회·어질리티 경기 운영 / 참가 반려견 안전 관리

현장 접수 전 참가견

예방접종 확인, 인식표 부착

예선 경기 종목별 운영

어질리티·운동회 종목 분산 진행

본선 진출 상위 선발

기록 기준 다음 라운드 선별

결승 시상 수상견 확정

현장 시상, 안전 동선 유지

물과 닿는 모든 공간을 잇는 수변 운영 체계

수영장 안전·위생 운영, 힐링캠프 정서 운영

화명생태공원 강변을 따라 수영장, 힐링캠프, 응급 동선을 하나의 흐름으로 연결한 운영 매뉴얼

반려견 수영장 운영

수질·위생 관리

순환 여과와 일 2회 잔류염소 측정으로 수질 유지. 입수 전 발 세척대 통과 의무화, 운영 2시간마다 표층이물 수거. 강물 직접 유입 차단 후 관리수 별도 충수.

입수 안전 통제

수심 구간 표지와 안전요원 상시 배치. 견종 크기별 입수 시간대 분리 운영. 흥분 개체 즉시 분리, 보호자 동반 입수 원칙으로 충돌 예방.

운영 종료 후 배수, 시설 소독, 매트 건조까지 일일 마감 점검표 작성

강변 힐링캠프 운영

휴식 공간 구성

강물을 바라보는 그늘막과 좌식 매트로 속도를 늦추는 쉼의 공간 조성. 반려견 급수대와 그늘 쉼터를 짝지어 배치, 더위 시 휴식 동선을 단순화.

정서 교감 운영

보호자와 반려견이 함께 머무는 교감 프로그램 상시 진행. 소음과 혼잡을 낮춘 저자극 구역 별도 지정, 노령견과 소형견 우선 배려 동선 운영.

쓰레기 분리수거와 배변 처리대를 동선마다 배치해 강변 환경 보전

수변 응급 연계

동선과 대응 연계

수영장과 힐링캠프, 의무실을 최단 동선으로 연결. 물가 미끄럼 방지 매트와 경계 펜스로 추락 위험 선제 차단. 응급 통로는 항상 비워 두고 표지로 안내.

단계별 조치 매뉴얼

평시 순찰, 주의 시 안내 강화, 경계 시 입수 통제, 위험 시 즉시 폐쇄와 응급 이송으로 이어지는 4단계 대응. 안전요원과 운영 본부 무전 상시 연결.

익수 사고 대비 구조 장비 비치, 보호자 안내 방송으로 사고 예방 우선

화명생태공원 강변 전체 공간 조감

잔디광장 약 17,000m², 강을 따라 흐르는 존 구성 조감

[3D 공간조성 전체 조감 연출컷 자리]

디자이너 작업 영역

조감 구성 요소

감동진 나루터 앞 잔디광장

약 17,000m² 전체 배치 기준면

강을 따라 흐르는 존 배열

수변에서 광장 안쪽으로 깊어지는 동선

강변 배경 메인무대

강을 배경으로 둔 관람 시야 확보

수변 체험존, 그늘막 쉼 공간

물과 닿는 공간을 잇는 힐링 동선

강변에서 시작해 광장 안으로 흐르는 하나의 동선으로, 속도를 늦추고 교감하는 강변 힐링의 하루를 공간으로 담음.

메인무대와 강변 힐링존 연출 디테일

강물을 배경으로 둔 무대, 물가에서 속도를 늦추는 힐링캠프의 하루

[3D 메인무대 연출컷 자리]

강변을 배경으로 둔 메인무대 주간·야간 연출

디자이너 작업 영역

[강변 힐링캠프 연출컷]

에어돔·빈백 휴식 공간 3D 시안

디자이너 작업 영역

연출 디테일 포인트

강물 수면을 무대 백드롭으로 차용, 자연 배경 그대로 연출

잔디광장 중앙 무대, 어디서나 보이는 개방형 배치

물가 따라 빈백·그늘막 힐링존, 속도를 늦추는 휴식 동선

야간 조명으로 강변 수변 분위기 연장, 머무는 저녁 연출

수영장·Dog스포츠·부스존 배치 연출

물과 닿는 체험 공간과 부스존을 강변 동선 위에 배치한 3D 연출 시안

[3D 수변 체험·부스존 연출컷 자리]

반려견 수영장, Dog스포츠 경기장, 몽골텐트 부스존 배치 조감

디자이너 작업 영역

연출 포인트

● 반려견 수영장

물가에 인접 배치, 입수 동선과 대기 공간 분리 연출

● Dog스포츠 경기장

잔디광장 활용, 관람 객석과 경기 라인 구분 연출

● 몽골텐트 부스존

체험 부스 일렬 배치, 비반려인 진입로 별도 확보

강변 동선을 따라 물 체험 공간과 활동 공간을 묶고, 비반려인 진입로를 분리해 모두가 머무는 수변 배치 설계


법정 의무를 빈틈없이 이행하는 안전관리 총괄 시스템

공연법, 재난안전관리기본법, 중대재해처벌법 준수, 안전관리 총괄 조직

법정 안전 의무 이행 체계

공연법	재난안전관리기본법	중대재해처벌법
객석 1천명 이상 공연 재해대처계획 신고, 관할 소방서, 경찰서 사전 협의. 무대 가설구조물 구조안전 확인서 확보. 화명생태공원 잔디광장 약 17,000 m ² 임시 시설물 안전점검 의무 이행.	지역축제 안전관리계획 수립, 부산시 안전관리위원회 사전 심의 대응. 평시에서 위험까지 단계별 비상 대응 체계 사전 보고. 행사 2일간 기상 단계별 조치 매뉴얼 연동 운영.	설치, 운영, 철거 전 과정 위험요인 사전 평가. 종사자 안전보건 확보 의무 이행, 작업 전 안전교육 기록 유지. 도급 협력업체 포함 현장 안전관리 책임 일원화 체계 구축.


안전관리 총괄 조직과 책임 분담 구조

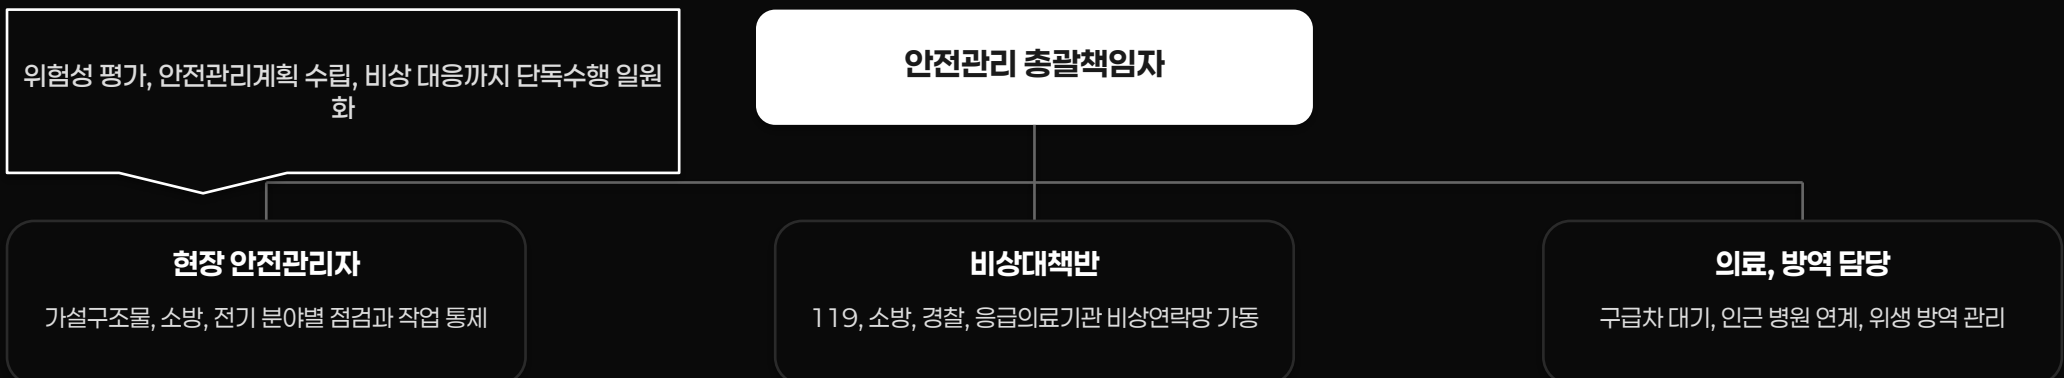


평시에서 위험까지 단계별로 작동하는 개물림 대응 매뉴얼

평시 주의 경계 위험 단계 대응, 현장 응급 동선 확보

단계별 대응 매뉴얼

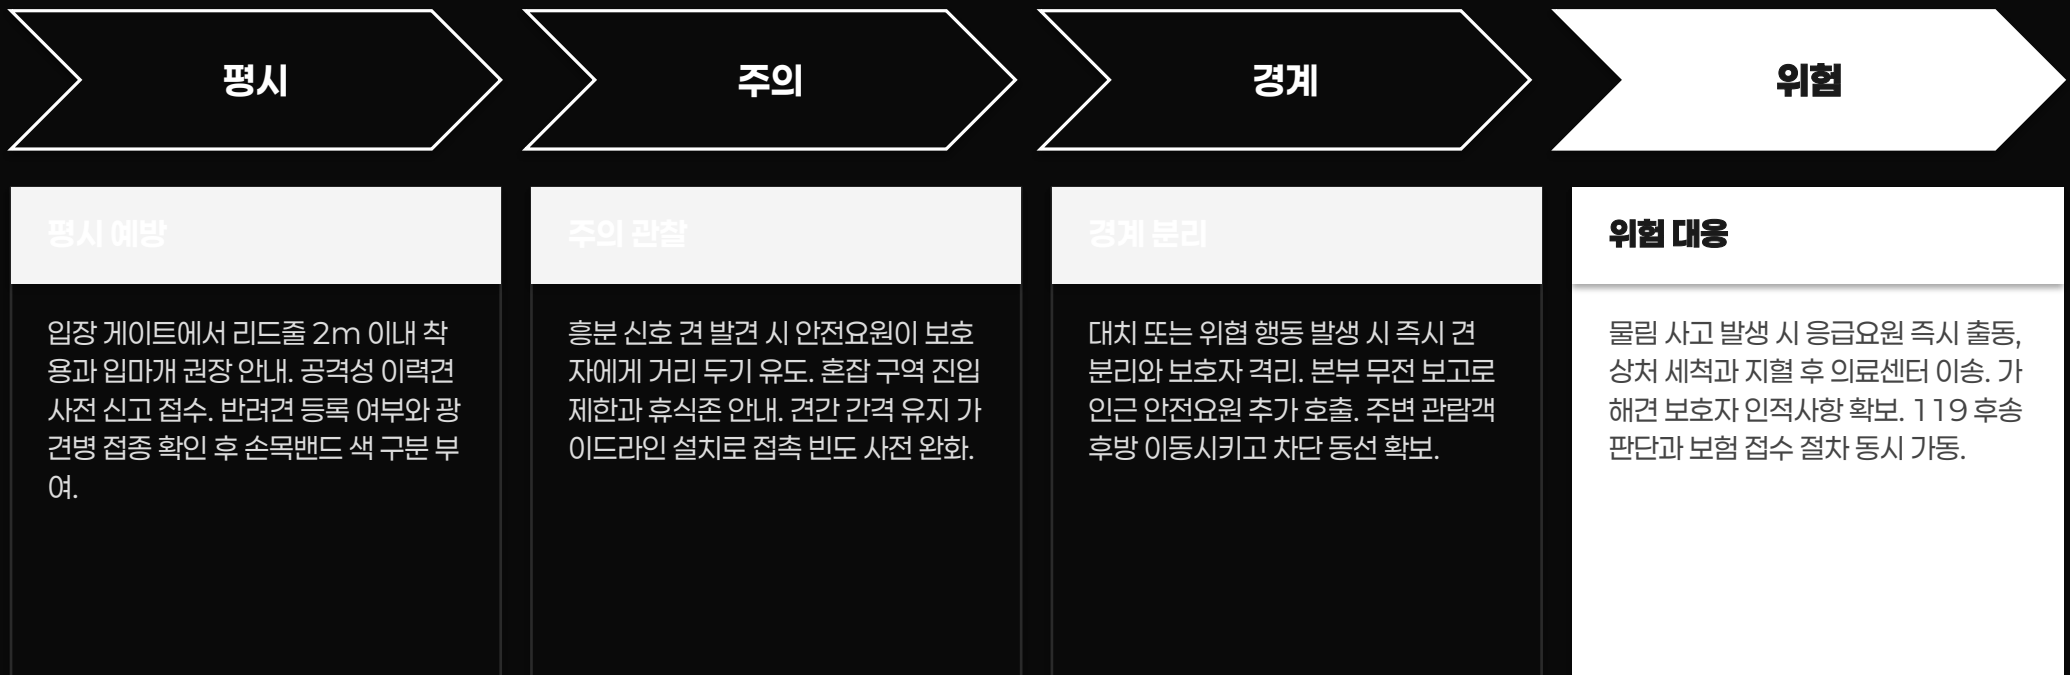

사고 발생 시 응급 동선과 보상 절차



물가 행사의 특수 위험을 선제 차단하는 안전 동선

수변 익수 동물 방역 대비, 응급 의료 거점 운영

화명생태공원 강변 17,000m², 물과 닿는 공간을 좌우로 나눠 수변 안전과 응급 거점을 동시에 배치

수변 익수 대비 안전 동선

반려견 수영장 보트존 수변 안전요원 배치

수영장 입수 구역마다 안전요원 상시 배치, 입수 가능 두수 제한과 회차 운영으로 과밀 차단. 보트 탑승 전 구명조끼 착용 점검을 의무화하고 미착용 탑승 통제.

익수 발생 대비 구조 장비 비치

구명환, 구조로프, 견인봉을 수변 구간별로 분산 비치하고 위치 표지 설치. 익수 의심 상황 발생 시 호각 신호로 즉시 구조 인력을 호출하는 비상 호출 동선 운영.

수심 경계선 표시와 출입 통제

강변 깊은 구간은 부표선과 통제 라인으로 경계를 명확히 하고, 보호자 미동반 입수 차단을 위한 출입 게이트 운영.

응급 의료 거점 운영

사람 응급처치소 강변존 중앙 배치

응급처치요원 상주, 응급처치 키트와 자동심장충격기 비치. 환자 상태에 따라 현장 처치 후 인근 병원 후송 동선 사전 확보.

응급 동물 의료 거점 별도 운영

수의 인력 대기, 인근 동물병원 후송 연계

동물 방역 위생 관리

입장 방역 게이트 출입 관리

입장 시 발 소독매트 통과와 인식표 확인으로 미접종 동반 차단, 발열 의심 동물 별도 안내.


행사장 위생 순환 청소

배변 처리 구역 지정, 정기 소독과 폐기물 즉시 수거

총괄에서 현장까지 책임이 닿는 단독수행 인력 체계

PM 총괄 운영 조직 / 전문인력, 자원봉사자 운영

PM 총괄 조직 구조

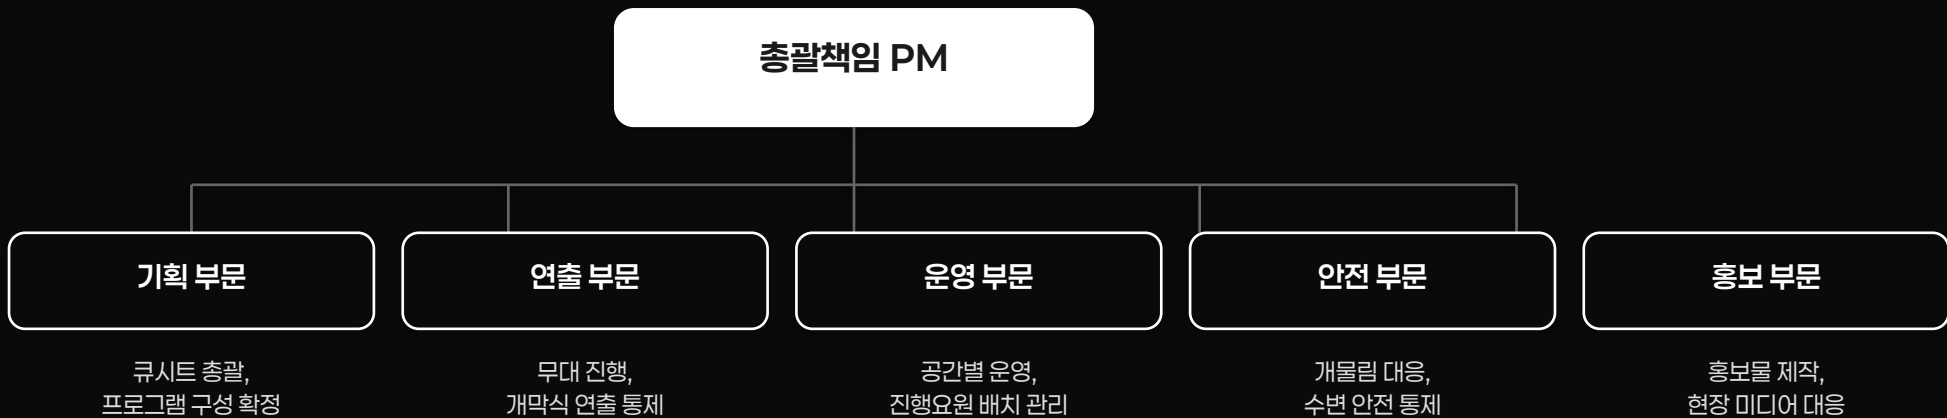

전문인력, 자원봉사자 역할 분담

전문인력 (대행사 직접 배치)

총괄 PM 1인, 부문별 팀장이 기획부터 안전까지 직접 책임. 슈퍼바이저가 진행요원 인력관리, 전담 디자이너가 홍보물 제작. 착수 직후 투입해 행사 종료까지 일관 운영. 외주 재하도급 없이 단독이행 원칙으로 핵심 부문 직접 배치.

자원봉사자, 모범운전자 (협력 운영)

체험 부스 보조, 강변 동선 안내, 주차장 진입 통제를 전문인력 지휘 아래 분담. 행사 전 사전 교육과 리허설을 거쳐 배치. 모범운전자가 교통 통제 협조. 단순 보조 역할에 한정하고 안전, 진행 통제는 전문인력이 직접 수행해 책임 소재 명확화.

공간별 안전과 진행을 동시에 잡는 현장 인력 배치

진행요원·안전요원 배치, 주차·청소·방역 운영

공간별 인력 편성

메인무대 존	Dog스포츠 경기장	반려견 수영장 강변존
무대 진행요원, 출연자 동선 안내, 객석 질서 관리 분담 배치. 음향 조명 송출 시간대 집중 인력 운용. 현장 선포 개막 진행 시 정면 객석 안전요원 전면 배치, 무대 양 측면 비상 통로 상시 확보 운영.	경기 진행요원과 안전요원 2인 1조 동반 배치. 반려견 입퇴장 게이트 분리 통제, 관람 펜스 외곽 안전 간격 유지 안내. 개물림 돌발 상황 대비 대응요원 경기장 인접 상주, 즉시 분리 동선 사전 확보.	수변 특화 안전요원 집중 배치, 수영장 둘레 상시 감시 구간 분할 운영. 익수 미끄럼 사고 대비 구조 장비 비치 인력 지정. 강변 힐링램프 입구 진행요원 안내, 물가 접근 경계선 표시 구간 순찰 인력 순환 배치.

시간대별 안전·진행요원 운영 (10.3.~10.4. 2일간)

시간대	진행요원 배치	안전요원 배치
개장 전 점검	동선 표지 배치, 부스 운영 사전 안내	시설물 결박 펜스 점검, 위험 구간 표시
개막 집중 시간	메인무대 객석 안내, 입장 동선 분산	객석 정면 전면 배치, 비상 통로 확보
체험 운영 시간	수영장 Dog스포츠 순환 안내	수변 감시 2인 1조, 개물림 대응 상주
폐장 정리	잔류 관람객 안내, 퇴장 동선 유도	강변 경계 순찰, 시설 잔존 위험 점검

강변 환경에 최적화한 시설 조성 and 조달 운영

몽골텐트, 의자, 테이블 조성 / 조달 품질 관리

화명생태공원 잔디광장 약 17,000m², 강변 지형에 맞춘 설치부터 철거 원상복구까지 단독 운영

조달 운영 흐름



강변 지형 대응 조성

잔디광장 약 17,000m² 경사와 연약 지반 사전 측량, 몽골텐트 하부 보강판 깔아 침하 방지.

강풍 대비 텐트 모서리 추가 고정 앵커, 의자 테이블 배수로 따라 단차 보정 후 수평 설치.

수변 경계 안전선과 차단 펜스로 관람 동선과 조성 구역 분리.

조달 검수 품질 관리

물품 입고 시 수량, 규격, 파손 여부 3단계 검수 후 관리 대장 기록.

몽골텐트 골조 부식, 의자 테이블 균열 등 결함품 즉시 교체 요청.

조달 품목별 책임 담당 지정, 설치 직전 재점검으로 현장 누락 차단.

철거 원상복구

행사 종료 후 폐장 시간까지 임대물 반납, 시설물 철수 순차 진행.

앵커 고정 자국, 잔디 답압 구역 복토 후 원상 회복, 폐기물 분리 처리.

생태공원 환경 정리 후 발주처 입회 점검으로 인계 마무리.

예상 리스크를 미리 짚어 멈추지 않는 운영

기상·혼잡·돌발 시나리오, 사전 대응 체크리스트

기상 리스크 사전 대응 시나리오

우천 대응

행사 7일 전부터 화명생태공원 일원 기상 매일 체크, 강수 예보 시 시간별 실시간 모니터링.
관람객 우의와 반려동물 우비 비치, 메인무대 상부 천막 점검, 전기케이블과 음향장비 방수커버 사전 부착.
강변 지대 배수로 막힘 사전 제거.

폭염 대응

강변 잔디광장 그늘막과 미스트존 운영, 동선 곳곳에 음수대와 반려견 급수대 배치.
폭염주의보 발령 시 야외 체험 시간 단축, 경보 발령 시 발주처 협의 후 프로그램 축소 또는 일정 조정.
응급쿨링 키트와 얼음팩 비치.

돌발 상황 대응 체크리스트

혼잡

공연 시작과 종료 시각 인원 집중 분산 유도.
입장 게이트 통제선과 동선 안내요원 배치.
비상 대피로 사전 안내방송, 수영장과 Dog스포츠 구역 정원 초과 시 입장 대기 운영.

동물 돌발

개물림 우려 시 즉시 격리, 응급처치요원 판단 후 인근 병원 후송.
반려견 흥분 완화 쿨다운존 운영, 입마개 미착용 점검.
수영장 익수 대비 안전요원 상시 감시.

시설 고장

음향과 조명 예비 장비 현장 대기, 무대 전원 이중화.
정전 시 비상 발전기 즉시 전환.
수영장 펌프와 여과기 점검자 상주, 가설 구조물 결속 상태 수시 확인.

리스크 등급별 의사결정과 보고 체계



IV

행사운영역량·홍보·사업비

1

유사 행사 경험으로 검증된 현장 대응 역량

기획에서 현장 운영까지 끊임 없이 잇는 일관 수행 체계

약 17,000m² 강변 부지에서 동선과 안전을 동시에 잡는 야외 운영 경험

착수일부터 2026.10.30. 정산까지 단독으로 책임지는 사후관리 체계

유사 축제 운영 실적

[유사 행사 실적 placeholder, 디자이너 영역]

수변 행사 노하우

물가 미끄럼과 우천에 대응하는 동선 운영 경험

현장 통제 경험

다중 공간 동시 진행을 본부에서 실시간 통제

단독수행 체계

기획부터 사후관리까지 단일 책임으로 운영

현장 상황을 실시간으로 통제하는 운영 본부 시스템

통합 운영본부

통합 운영본부 운영, 무전과 메신저 기반 실시간 소통 체계

통합 운영본부 지휘 체계

화명생태공원 잔디광장 중앙에 통합 운영본부를 설치해 모든 현장 상황을 한 곳으로 모은다. 메인무대, 반려견 수영장, Dog 스포츠 경기장, 부스존 각 구역장이 현장 정보를 본부로 전파하면, 본부는 상황을 조정하고 의사결정을 내려 다시 각 구역으로 통제 지시를 내린다. 평시와 위험을 일반과 비상으로 나눠 어떤 상황도 발생 즉시 대처 가능한 대응책을 구비한다. 안내, 진행, 안전, 의료, 방역 정보를 본부가 종합 관리하며, 단독수행 체계 안에서 총괄 PM이 최종 지휘권을 가진다.

실시간 소통과 민원 대응

무전 채널을 구역별로 분리해 메인무대, 수변, 체험존이 동시에 끊임 없이 교신하고, 카카오톡과 텔레그램 메신저로 현장 사진과 작업 파일을 즉시 공유한다. 본부는 정기 브리핑과 수시 보고를 정례화해 강변을 따라 흐르는 긴 동선에서도 빈 곳 없이 상황을 파악한다. 관람객 안내소를 권역별로 배치해 분실건, 미아, 위생 민원을 접수 즉시 담당 구역으로 연결하고, 본부가 처리 결과까지 추적해 마무리한다. 돌발 상황 발생 시 화상 미팅으로 즉각 의사결정을 공유한다.

예고에서 현장 확산까지 단계로 설계한 **홍보 흐름**

STEP 01

사전 예고 단계

유도사인, 가로등 배너로 인지도 제고

STEP 02

참여 욕구 자극

SNS 이슈영상으로 참여 동기 형성

STEP 03

당일 집객 확산

현장 실시간 콘텐츠로 집객 극대화

STEP 04

사후 인식 확대

행사 사진 공유로 복지 메시지 지속

이미지 영역

온라인과 오프라인을 채널별로 나눠 잡는 도달 전략

SNS·언론·홈페이지 운영, 동물복지 홍보대사 연계

ONLINE 채널

공식 SNS 운영

인스타그램, 카카오톡 채널 개설. 행사 안내 카드 뉴스, 반려견 동반 코스, 강변 힐링 프로그램 예고를 주 2회 게시.

검색 노출

위드팻스타 키워드 검색 시 홈페이지 상단 노출. 파워링크와 반려동물 카페, 블로그 후기글 게시로 잠재 참여층 유입.

참여 유도

해시태그 인증 이벤트, 카카오 알림톡 발송으로 사전 신청자 재방문 유도와 현장 참여 전환.

OFFLINE 채널

언론 보도

행사 개최와 동물복지 현장 선포를 알리는 보도 자료 배포. 지역 일간지와 부산 권역 매체에 사전 예고, 현장 단신 송출.

옥외 홍보

화명생태공원 인근 버스정류장, 지하철 동선에 현수막과 배너 게첨. 강변 유동인구와 반려인 밀집 지역 집중 노출.

커뮤니티 연계

구 단위 반려동물 모임, 지역 동물병원 게시 협조로 시민 커뮤니티 입소문 확산.

허브 운영

홈페이지 허브

행사 고지, 프로그램 안내, 사전 신청, 아카이빙 기능을 모은 공식 홈페이지. 모든 채널이 모이는 커뮤니케이션 허브로 운영.

홍보대사 연계

동물복지 홍보대사 인터뷰, 반려견 동반 영상 콘텐츠를 SNS와 홈페이지에 동시 게시해 신뢰 기반 확산.

콘텐츠 환류

현장 하이라이트 영상과 후기를 종료 후 게시해 다음 회차 참여 기반으로 환류.

후원과 협찬으로 행사 가치를 함께 키우는 수익 구조

후원, 협찬, 광고상품 유치 / 반려 산업 연계

총사업비 180,000,000원 내 운영을 기본으로 두고, 발굴한 수익을 행사 품질 제고에 재투자하는 선순환 구조 확립

후원 유치 방안

반려동물 보호 취지에 부합하는 공공기관과 동물복지 유관단체를 우선 접촉.

지역 연고 기업을 먼저 두고 행사 취지에 공감하는 후원사를 단계별로 유치.

공익성을 저해하는 영리 추구는 최소화하고, 후원사 명의 노출 위치를 사전 협의로 확정.

협찬 유치 방안

반려 산업 브랜드와 연계한 현물 협찬 모델 설계.

사료, 간식, 용품 브랜드의 시제품 체험 부스를 운영하고 협찬품을 참여 시민에게 제공.

브랜드 노출과 시민 체험을 맞바꾸는 상생형 협찬으로 행사 비용 부담 경감.

광고상품 유치 방안

현수막, 안내판, 프로그램 책자에 협찬사 로고를 담는 광고상품 개발.

반려견 굿즈에 후원사 명의를 새겨 행사 후에도 노출이 이어지는 상품 구성.

온라인 사전홍보 채널에도 후원사 노출 구좌를 마련.

수익 재투자 구조

수익 발굴



투명 관리



품질 재투자



체감 가치

발주금액 이내에서 투명하게 집행하는 사업비 운용

사업비 180,000,000원 이내 운용, 과다계상 방지 집행으로 발주 신뢰 확립

총 사업비 한도

180,000,000원

착수일부터 2026.10.30.(금) 정산 완료까지, 발주금액 한도 내 항목별 배분으로 운용

0

항목별 배분 원칙

과다계상 방지

표준 품셈과 시중 단가 기준으로 항목별 단가 검증. 동일 항목 중복 계상 차단, 산출 근거 명시로 거품 제거

예산 효율 제고

인하우스 기획, 디자인 인력 직접 운용으로 외주 마진 절감. 협력사 가설물 재사용으로 강변 조성비 최적화

구분	세부 내용	배분 비중
행사장 조성, 시설	메인무대, 수영장, Dog스포츠장, 부스존 강변 가설물 조성과 진행비	34%
프로그램, 출연	개막식, 기념식 연출, 강변 힐링 체험, 축하공연 섭외 진행비	26%
홍보, 인쇄	키비주얼 적용 온오프 홍보, 굿즈, 인쇄물 디자인과 제작비	14%
인건비, 운영비	총괄PM, 현장 전담인력 운용비, 보험, 방역, 안전관리비	16%
일반관리비, 이윤	과업 수행에 필요한 일반관리비와 이윤, 부가세 포함 정산	10%


V

사업관리

착수에서 정산까지 **누락 없이** 관리하는 추진 일정

착수일 ~ 2026.10.30 / 단계별 마일스톤

5단계 추진 흐름



단계별 핵심 과업

기본계획 단계

착수계 제출과 행사 전체 추진 방향 확정. 발주처 협의와 현장 답사로 화명생태공원 잔디광장 약 17,000m² 공간 점검.

세부계획 단계

프로그램 큐시트와 공간 배치도 확정. 안전관리 매뉴얼과 인력 배치표 수립, 물품 조달 발주 착수.

준비실행 단계

시설 설치와 무대 조성, 리허설 진행. D-1 최종 점검으로 동선과 안전 시설 작동 상태 확인.

현장운영 단계 · 2026.10.3 ~ 10.4 (2일간)

운영본부 실시간 통제, 개막식과 강변 힐링 프로그램 진행, 안전 단계별 대응 가동

정산환류 단계 · ~ 2026.10.30 (사업 종료)

결과보고서와 산출물 제출, 사업비 정산 완료. 사후 환류로 차기 정책 연계 자료 정리.

정기 점검과 보고로 품질을 유지하는 관리 체계

정기 보고 절차, 품질 점검 기준

발주처 정기 보고와 협의 절차

수시 보고

일일 점검 결과와 주요 이슈를 발주처에 즉시 공유. 섬외 현황과 진척 실적을 그날 정리해 환류.

정기 중간 보고

준비 단계별 진행 상황과 운영 매뉴얼 수립 현황을 정리해 보고. 발주처 협의로 수정 사항을 반영.

결과 최종 보고

2026.10.30.(금) 정산까지 결과보고서, 사진과 영상 기록물, 만족도 조사, 보도 노출 집계를 제출.

준비 단계별 품질 점검과 시정

준비 단계 점검

조성 자재는 승인과 확인 후 진행. 단계별 검토회의로 일정 대비 진척과 요구 사항 충족 여부를 점검.

현장 품질 모니터링

화명생태공원 잔디광장 약 17,000m² 운영본부에서 공간별 진행과 품질을 실시간 통제. 이슈 발생 즉시 시정 지시.

개선 환류 체계

점검에서 발견한 미흡 사항은 시정 지시와 재확인을 거쳐 종결. 환류 내용을 기록해 다음 단계 운영에 반영.

청렴과 보안을 약속으로 지키는 사업관리

청렴계약 이행서약, 보안서약 준수, 개인정보 보호를 한 묶음으로 관리하는 약속 이행 구조

청렴 이행

청렴계약 이행서약서 제출

착수 즉시 계약서약 제출, 금품·향응 수수 금지를 전 인력 사전 교육으로 명문화

협력사 청렴 동참 서약

조달·시공 협력사까지 청렴 서약을 확장, 분리 거래로 이해충돌 사전 차단

투명 정산 기록 보존

집행 증빙 상시 보존, 발주처 요청 시 즉시 열람

보안 준수

보안서약서 전원 제출

투입 인력 전원 보안서약 제출, 발주처 자료 외부 반출과 무단 복제 금지를 서약에 명시

참여자 개인정보 보호

사전 신청과 현장 접수 정보를 행사 목적 외 사용 금지, 종료 후 즉시 파기 원칙 적용

자료 접근 권한 관리

업무별 접근 권한 분리, 반출 이력 기록 보존

법규 준수

평가 자료 익명 표기

평가용 제출 자료에 업체 인식 표기 일체 금지, 로고와 상호 노출 사전 점검 후 제출

동물보호 관련 법령 준수

반려견 동반 행사 특성 반영, 동물보호법과 공원 이용 규정에 맞춘 운영 기준 적용

계약 이행 규정 준수

착수일부터 2026.10.30.까지 약정 사항 준수

착수 시 서약 제출, 행사 전 점검, 종료 후 정보 파기까지 한 흐름으로 관리하는 약속 이행 체계

검증된 전문인력으로 구성된 수행 조직

5년 이상 유사 행사 경험자로 구성, 총괄에서 현장까지 책임이 닿는 단독수행 인력 체계

총괄 PM 이력

[총괄 PM 이력 자리]

성명 / 직책 / 보유 자격
유사 행사 총괄 수행 이력
착수일부터 정산까지 단독 책임

디자이너 / 사용자가 채울 자리

부문별 핵심 인력 이력

[부문별 핵심 인력 이력 자리]

프로그램 / 운영 / 홍보 / 조성 팀장
부문별 업무 분장과 협조 체계
슈퍼바이저 진행요원 인력 관리

디자이너 / 사용자가 채울 자리

전문인력 자격, 경력

[전문인력 자격, 경력 자리]

구분 / 성명 / 보유 자격 / 유사 행사 경력 / 투입 기간 항목 정리. 수상 안전 부문은 인명구조요원 자격 소지자, 응급 대기는 응급구조요원 배치.

디자이너 / 사용자가 채울 자리

행사 종료가 끝이 아닌 결과보고까지 책임지는 마무리

문체부 평가기준 준수, 결과보고서 정산보고서 제출

기획 단계부터 결과 분석까지, 행사 종료 후 한 달 안에 누락 없이 보고를 받는 체계

01	결과자료 취합	02	결과보고서 작성	03	산출물 정산 제출
행사장 운영, 프로그램, 홍보, 부대행사 결과 일괄 취합					
키비주얼 패널 제작물 시안 원본 보관					
2일간 현장 기록 사진 영상 확보					
참가자 등록 DB 통계화					
업무일지 회의록 공문 문서 정리					
문화체육관광부 평가기준에 맞춘 결과보고서 작성					
계획 실행 결과 흐름으로 정리					
인력 물자 운영 현황 커뮤니케이션 결과 포함					
행사 성과 분석 개선 방향 총평 수록					
차기 위드펫스타 준비 반영 가능한 기록					
결과보고서 회계정산보고서 제출					
현장 사진 스케치 영상 USB 매체 제출					
참가자 설문조사 만족도 결과 첨부					
예산 집행 내역 총괄 정산서 작성					
발주처 검수 후 투명 정산 마감					

행사 종료 후 한 달 이내 보고 완료, 다음 동물복지 정책으로 잇는 환류 기록 마감

한 번의 축제를 다음 복지 정책으로 잇는 사후 환류

만족도 조사·성과 분석으로 멈추고, 차기 개선 제언으로 다시 흐르는 환류 구조

AS-IS 축제 종료가 끝

현장 만족만 짐작, 데이터 부재

참여 시민 반응이 기록으로 남지 않아 다음 행사 기획에 근거가 끊김

프로그램별 평가 단절

개막식, 강변 힐링체험, Dog스포츠 등 운영 성과가 흩어져 개선점 도출이 어려움

축제와 정책의 단절

행사가 일회성에 그치고 동물복지 도시 정책으로 이어지는 환류가 없음

환류

TO-BE 다음 정책으로 환류

참여 시민 만족도 조사

모바일 설문으로 행사 종료 즉시 만족도 수집, 응답 시 기프티콘 제공으로 참여율 확보

프로그램별 성과 분석

공간별 참여 데이터를 분석해 운영 평가 보고서로 정리, 개선점을 항목별로 도출

차기 축제 발전 제언

우수 의견을 차기 동물보호의 날 축제 기획에 연계, 동물복지 도시 정책 자료로 환류

조사 일정 행사 종료 후 모바일 설문 운영, 종료 1개월 이내 성과 분석 보고서 납품으로 환류 마무리

강변과 복지 대전환을 한 몸으로 엮은 단 하나의 제안

물이라는 단 하나의 주제어로 컨셉과 화합, 안전을 한 줄기로 흐르게 한 차별화 구조

차별화 3축

01

강변 힐링
컨셉 통합

물을 주제어로 묶은 통합 컨셉

화명생태공원 강변을 그대로 살린 힐링 동선.
속도를 늦추고 물가에서 교감하는 하루로 컨셉,
슬로건, 프로그램을 한 줄기로 흐르게 한 설계

02

화합 구조
증명

비반려인 진입로로 잇는 공존

반려인과 비반려인이 함께 머무는 진입 동선과
쉼터 배치로 화합을 눈으로 증명. 동물복지를
모두의 일상으로 잇는 공존의 장면 설계.

03

빈틈없는
안전 운영

개물림 단계 대응 매뉴얼

평시에서 위험까지 단계로 작동하는 개물림 대
응과 수변 안전 동선. 물가 행사의 특수 위험을
선제 차단하는 안전 운영 체계.

물 하나로 통합한 단 하나의 제안

지역제한과 단독이행 요건을 모두 충족한 수행 적격

입찰 자격, 단독 이행, 직접 생산 요건을 모두 갖춘 적격 수행 주체로 응찰 준비

사용자 확인 영역 — 아래 자격 요건은 제안사 실제 정보로 채워 검증

지역제한 요건	단독 이행 요건	자격, 생산 확인
부산광역시 내 영업소 소재 [입찰 공고일 기준 부산광역시 내 본점 또는 영업소 등록 placeholder] 사업자등록증, 영업소 등기로 소재지 증빙 [증빙 서류 제출 항목 placeholder] 디자이너, 사용자가 채울 자리	단독 입찰, 하도급 불가 준수 [공동수급 없이 단독 수행 placeholder] 기획에서 안전까지 전 과정 자사 직접 이행 약속 [하도급 제한 준수 확약 placeholder] 디자이너, 사용자가 채울 자리	자격 요건, 직접 생산 확인 [행사대행업 등록, 직접 생산 확인 증명 placeholder] 결격 사유 없음 확인서 제출 [자격 증빙, 청렴 서약 항목 placeholder] 디자이너, 사용자가 채울 자리

사업 기간 착수일부터 2026.10.30.(금)까지, 예산 180,000,000원 이내 전 과정 단독 이행 약속

보호를 넘어 복지로의 대전환

강변에서 시작되는 부산 동물복지 도시의 도약

반려와 사람이 함께 흐르는 하루의 약속

- 성숙한 반려 문화 확산에 대한 의지
- 동물복지 선도 도시 부산과 함께 만드는 하루의 여정



감사합니다

강물처럼, 함께 흐르는 하루



2026 위드펫스타와 함께

